
Raport ewaluacyjny z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra – ocena aktualności i stopnia realizacji Programu w latach 2023-2025

I. Wstęp

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (dalej GPR, Program) jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze miasta, przy współudziale lokalnej społeczności. Program został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i przyjęty uchwałą nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r. W opracowaniu dokumentu kluczową rolę odegrała „Diagnoza Obszaru Zdegradowanego" dla Miasta Jelenia Góra, na podstawie której zidentyfikowano obszary miasta charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a następnie wyznaczono obszar rewitalizacji miasta zajmujący powierzchnię 858,19 ha (7,86% powierzchni miasta) i obejmujący trzy podobszary:

- podobszar rewitalizacji Śródmieście (523,12 ha),
- podobszar rewitalizacji Cieplice (231,57 ha),
- podobszar rewitalizacji Sobieszów (103,5 ha).

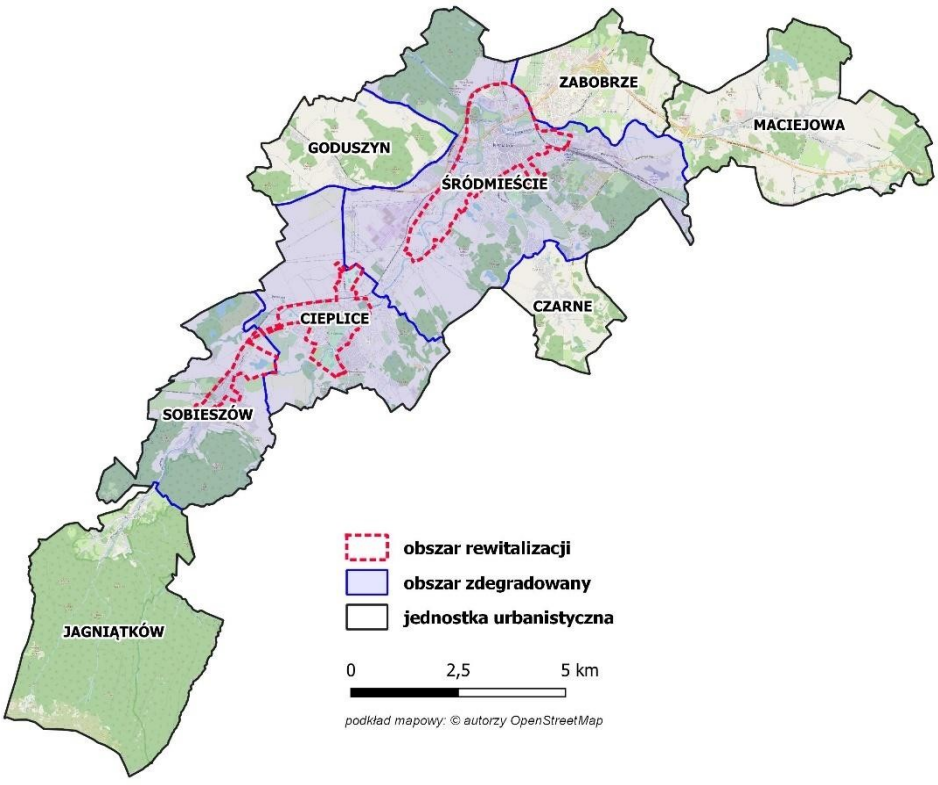

Grafika 1. Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra zawarta został wizja miasta stanowiąca swojego rodzaju oczekiwany obraz miasta po realizacji zaplanowanych w Programie przedsięwzięć, a tym samym będąca odpowiedzią na zidentyfikowane w „Diagnozie Obszaru Zdegradowanego" problemy. Wizja została zdefiniowana dla całego obszaru rewitalizacji, a także dla poszczególnych, autonomicznych i zróżnicowanych pod względem architektoniczno-

przyrodniczym podobszarów. Wizja obszaru rewitalizacji oraz podobszarów przedstawiona została poniżej.

Wizja obszaru rewitalizacji

„Jelenia Góra jest miastem, w którym przeprowadzono wzorcową w skali województwa dolnośląskiego rewitalizację. Miasto odnotowało widoczny postęp w zakresie ograniczenia problemów społecznych, marginalizacji grup mieszkańców, poprzez aktywną politykę aktywizacyjną (społeczną) wynikającą z rozszerzenia oferty wsparcia świadczonej przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W mieście nastąpiła wyraźna poprawa w estetyce i funkcjonalności obiektów publicznych oraz mieszkalnych w aspekcie architektonicznym oraz środowiskowym. Jelenia Góra jest miastem otwartym, przyjaznym mieszkańcom, zwłaszcza tym zagrożonym wykluczeniem społecznym. W efekcie realizacji procesu rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra dokonała się realna i widoczna zmiana na każdym z trzech wyznaczonych i specyficznych podobszarach rewitalizacji. Śródmieście odzyskało i wzmocniło swoją funkcję centrotwórczą, Cieplice odzyskały dawną historyczną świetność, typową dla swojego uzdrowiskowego dziedzictwa, a Sobieszów znacząco poprawił warunki życia i rozwoju swoich mieszkańców, a nadto stał się centrum świadczenia usług opiekuńczych. Rewitalizacja umożliwiła znaczące ograniczenie problemów społecznych, a przemyślane inwestycje infrastrukturalne umożliwiły kreowanie inicjatyw i projektów społecznych kluczowych dla poprawy jakości życia na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. Wizytówką rewitalizacji są odnowione obiekty, bezpieczne drogi i nowocześnie urządzone tereny zielone”.

Wizja podobszaru rewitalizacji Śródmieście

„Podobszar rewitalizacji Śródmieście jest centrum świadczenia profesjonalnych usług społecznych z zakresu pomocy społecznej (zwłaszcza opiekuńczych), na bazie odnowionych obiektów, które są przystosowane do pełnienia funkcji centrów skupienia lokalnego. Estetyka i funkcjonalność to zalety Śródmieścia. Mieszkańcy czują się bezpiecznie i mogą korzystać w pełni z uroków miasta. Zapewniają im to przystosowane do tego tereny, odnowione obiekty, zagospodarowane przestrzenie. Poprawia się znacznie bezpieczeństwo. Instytucje i organizacje pozarządowe prowadzą aktywną działalność i odnoszą znaczące sukcesy w zakresie ograniczania problemów społecznych”.

Wizja podobszaru rewitalizacji Cieplice

„Cieplice to uporządkowane i estetyczne miejsce koncentracji ruchu turystycznego bazujące na zasobach naturalnych (przyrodniczych) oraz infrastrukturze uzdrowiskowej. Stan techniczny wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz estetyka zabudowy ulegają ciągłej poprawie, dzięki czemu stan środowiska naturalnego polepsza się. Dobre skomunikowanie, liczne atrakcje turystyczne generują ruch turystyczny, a przez to wzrost liczby miejsc pracy oraz dobrobytu mieszkańców”.

Wizja podobszaru rewitalizacji Sobieszów

„Sobieszów to miejsce, na którym przebiegła pomyślnie rewitalizacja w zakresie stworzenia profesjonalnej bazy dla rozwoju usług opiekuńczo - mieszkalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczone usługi opiekuńcze w placówkach do tego powołanych, pozwalają na zaspokojenie rosnącego popytu na tego typu usługi. Sobieszów staje się komfortowym miejscem zamieszkania, wykorzystującym swoje atuty dla rozwoju społeczno – gospodarczego”.

W dążeniu do osiągnięcia zaplanowanej wizji niezmiernie istotne było wyznaczenie celu głównego oraz celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań.
Celem głównym rewitalizacji jest *„przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup mieszkańców Jeleniej Góry poprzez skumulowane działania społeczne, infrastrukturalne oraz środowiskowe, w swym zamyśle będące tworzeniem miejsc, obiektów, przestrzeni dla działań i aktywności społecznych”*. Cele strategiczne zostały zdefiniowane dla trzech wymiarów:

1. Wymiar społeczny – **Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców**.
2. Wymiar przestrzenno-infrastrukturalny – **Spójność przestrzenno-funkcjonalna**.
3. Wymiar środowiskowy – **Lepsza jakość środowiska naturalnego**.

Zasadniczą rolę w osiągnięciu celów strategicznych odgrywa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do Programu zgłoszonych zostało 265 przedsięwzięć, w tym 230 zgłoszonych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, parafie (rzymskokatolicka, ewangelicko - augsburska), fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne, oraz 35 zgłoszonych przez Miasto Jelenia Góra oraz jego jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra (Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Teatr im C.K. Norwida w Jeleniej Górze) i Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra. Wśród zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych 20 zlokalizowanych było poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, w związku z czym nie zostały one ujęte w Programie.
Od momentu uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra minęły trzy lata. Dla wnioskodawców projektów zgłoszonych do GPR-u był to intensywny czas związany m.in.: z poszukiwaniem źródeł umożliwiających pozyskanie dofinansowania (zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych) na realizację zadań, z pozyskaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, a także przeprowadzeniem procedur przetargowych. Realizacji przedsięwzięć nie sprzyjała powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. i która poza szkodami m.in. w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, infrastrukturze drogowej przyczyniła się do sytuacji, w której wnioskodawcy projektów rewitalizacyjnych zmuszeni byli do zmiany decyzji dot. realizacji swoich zadań rewitalizacyjnych.
Niniejszy raport ewaluacyjny swoim zakresem obejmuje lata 2023-2025, a jego przedmiotem jest ocena aktualności i stopnia realizacji GPR-u. W raporcie dokonana zostanie m.in. ocena, stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do zakresu rzeczowego, osiągniętych wskaźników produktu i rezultatów oraz ocena osiągnięcia wskaźników dedykowanych poszczególnym celom rewitalizacji.

II. Stopień realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w formie kart projektowych. Zadania ujęte w poszczególnych kartach projektowych zostały przeanalizowane i pogrupowane w taki sposób, aby stanowiły odpowiedź na zidentyfikowane problemy oraz interwencję ukierunkowaną na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawiska w sferze społecznej, przestrzenno-infrastrukturalnej i środowiskowej. Stopień realizacji przedsięwzięć podstawowych w latach 2023-2025 przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Stopień realizacji przedsięwzięć podstawowych w latach 2023-2025

Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Stopień realizacji zadań w poszczególnych latach	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR	Kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2025 wraz ze źródłem finansowania
Podobszar rewitalizacji Śródmieście				
Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry				
1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania zaplanowano: 1. Budowę zadaszonej hali z lodowiskiem. 2. Utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. **Ad. 1. Budowa zadaszonej hali z lodowiskiem.** W 2022 r. w ramach zadania: - opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy krytego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą, - wyłoniono wykonawcę prac. W 2023 r. w ramach zadania wykonano: - budynek hali z lodowiskiem/ rolkowiskiem i trybunami, - zaplecze hali, - wyposażenie obiektu, - zagospodarowanie terenu wokół obiektu, miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej, - oświetlenie terenu, monitoring, - elementy małej architektury, - nasadzenia zieleni. Zadanie zrealizowano w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Zadanie zostało zakończone dnia 24.11.2023 r.	8 967 585,00 PLN	Ad. 1. Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2022-2023: 9 446 579,02 PLN Źródła finansowania: - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		Ad. 2. Utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. W 2023 r. w ramach zadania podpisano umowę dzierżawy dotyczącą części działki nr 40/2 i 41/1. W 2024 r. w ramach zadania: - złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry", zadanie: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, - przystąpiono do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami 1 Maja a Kilińskiego, - wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze w sprawie ustalenia koncepcji zabudowy od strony ul. 1 Maja. W I kwartale 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry", zadanie: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W IV kwartale 2025 r. Wykonawca przekazał Miastu program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami 1 Maja a Kilińskiego w Jeleniej Górze. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2027 r.		Ad. 2. 0,00 PLN

2. Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru dla Priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wniosek został poddany ocenie formalno-merytorycznej. Pomimo pozytywnej oceny, ze względu na wyczerpanie alokacji środków w ramach naboru projekt nie otrzymał dofinansowania. W 2025 r. złożono odwołanie. W związku z niewystarczającą ilością środków w ramach naboru, instytucja oceniająca zaproponowała udzielenie dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana. Dnia 27 października 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2029 r.	8 164 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 188 219,00 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.
3. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego	W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący odtworzenie elewacji z wątkiem kamiennym od strony ul. Jeleniej. W 2025 r. zadanie nie było realizowane. Zadanie w trakcie realizacji.	3 000 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 624 870,00 PLN Źródła finansowania: - dotacja z budżetu Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, - środki Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

4. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2023 r. przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania. Ze względu na fakt, iż złożone oferty przewyższyły środki finansowe przeznaczone na jego realizację, Wykonawca nie został wybrany. W 2024 r. wybrano wykonawcę zadania i zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - budowę łącznika drogowego o długości 33 m i powierzchni jezdni 335 m^2, - przebudowę ulicy o długości 170 m oraz powierzchni 912 m^2, - przebudowę oświetlenia ulicznego (montaż 12 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED), - budowę odcinka kanalizacji deszczowej, - wbudowanie kabla energetycznego do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, - uzupełnienie elementów małej architektury. Zadanie zostało zakończone dnia 12.11.2024 r.	1 405 700,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 1 938 685,68 PLN Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, - środki własne Miasta Jelenia Góra.
5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 11-13, 19/21, 36, 38-38OF, 54, 55, 82, ul. Okrzei 1-1a, 11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańskiej 3	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W 2024 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy ul. 1 Maja 11-13 rozpoczęto remont polegający na docieplenieu jednej ze ścian zewnętrznych budynku, - w budynku przy ul. Okrzei 11 wykonano remont nawierzchni przed budynkiem, jak również prace związane z instalacją wewnątrz budynku. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 19/21, 36, 38-38OF, 54, 55, 82*, ul. Okrzei 1-1a*, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańskiej 3 – nie rozpoczęto realizacji zadań	9 133 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 5 500,00 PLN Źródło finansowania: - środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrzei 11.

		rewitalizacyjnych. * Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.		
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród pięciu zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej, jedno zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4" zostało zakończone, natomiast drugie zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze" zostało zrealizowane w części dotyczącej „Budowy zadaszonej hali z lodowiskiem". Odnosząc się do pierwszego zadania zostało ono zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w GPR. Wskaźniki produktu, tj. długość wybudowanych dróg gminnych – 33,0 m oraz długość przebudowanych dróg gminnych – 170,0 m zostały osiągnięte. Tym samym wskaźniki realizacji przedsięwzięcia dedykowane celom rewitalizacji, w odniesieniu do tego zadania zostały osiągnięte w 100%. W ocenie podmiotu realizującego przedsięwzięcie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się, realizacja zadania wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej i komfortu poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. W ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze" zrealizowano zadanie pn. „Budowa zadaszonej hali z lodowiskiem". Podczas realizacji zadania wystąpiły niewielkie opóźnienia o charakterze proceduralnym, które nie miały wpływu na termin końcowy realizacji inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem wskazanym w GPR. W efekcie realizacji zadania osiągnięto wskaźnik produktu, tj. liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 1szt., co przełożyło się na osiągnięcie wskaźnika realizacji celów rewitalizacji. W ocenie podmiotu realizującego, inwestycja zdecydowanie wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności zamieszkania dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru, a także na wzrost atrakcyjności turystycznej. Nastąpił zdecydowany wzrost aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej. Estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. Realizacja zadania zdecydowanie przyczyniała się do wzrostu zadowolenia mieszkańców z jakości życia na rewitalizowanym obszarze. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta				
1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	W 2023 r. w ramach zadania wykonano budynek, a także przeprowadzono prace przygotowawcze do wykonania niezbędnych instalacji. W roku 2024, w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący:	5 000 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2025: 5 916 559,62 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 223 049,59 PLN

		- ocieplenie budynku, - montaż windy, - montaż pompy ciepła, - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, - wykonanie prac wykończeniowych. Zadanie zostało zakończone. Obiekt oddano do użytkowania dnia 01.06.2025 r.		Źródła finansowania: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Fundacja Castorama, - darowizny, - środki własne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie.
2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	Obiekt pod nazwą „Mieszkania chronione treningowe" został uruchomiony dnia 1 stycznia 2023 r. W celu dostosowania placówki do obowiązujących przepisów, od dnia 1 marca 2023 r. zmieniono nazwę obiektu na „Mieszkania treningowe". W 2024 r. w celu przystosowania funkcjonującej części obiektu do obowiązujących standardów, zrealizowano zakres rzeczowy zadania obejmujący: - wymianę instalacji elektrycznej, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - prace wykończeniowe (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie), - wyodrębnienie dodatkowej łazienki, - wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, - zamontowanie uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami w łazienkach i kuchni, - wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji, - ocieplenie dachu od wewnątrz, - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Zadanie zostało zakończone dnia 31.01.2025 r.	250 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2025: 189 731,12 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 49 483,07 PLN Źródła finansowania: - dotacja z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, - środki z Krajowego Planu Odbudowy, - darowizna Castorama - środki własne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie.

3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami	Fundacja „Nasza Fundacja”	W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - poszerzenie drzwi wewnętrznych (2 szt.), - zakup rampy podjazdowej. W 2025 r. w ramach zadania: - odświeżono ściany pomieszczeń, - zakupiono i zamontowano zmywarkę. Ponadto, w latach 2023-2025 r. realizowano działania miękkie polegające na organizacji zajęć w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych chorobą psychiczną. W realizowanych działaniach, każdego roku uczestniczyło 20 osób z niepełnosprawnościami oraz osoby towarzyszące. Zadanie w trakcie realizacji.	710 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2024-2025: 13 100,00 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 9 000,00 PLN Źródło finansowania: - dotacja.
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 15, 24, 36OF, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18,	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W 2023 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy ul. Groszowej 49 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, tj. zamontowano bramę wjazdową, wykonano część ogrodzenia oraz strefę odpoczynku dla mieszkańców z elementami małej architektury (klomby, donice na kwiaty, trawnik), - budynki przy ul. Jana Matejki 2, 6 pozyskały dokumentacje techniczną remontów elewacji, która przekazana została do uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, zlecono wykonanie audytów energetycznych obu budynków.	24 279 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 19 900,00 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41), 50 000,00 PLN (kredyt, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Bankowej 36OF), 40 234,00 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jasnej 1-2),

25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. Sudeckiej 9, 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofa 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32		W 2024 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 wykonano remont klatki schodowej, - w budynku przy ul. Bankowej 36OF wykonano remont dachu, - w budynku przy ul. Jasnej 1-2 wykonano remont kominów, jak również wymieniono instalację gazową, - w budynku przy ul. Sudeckiej 9 wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W 2025 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy ul. Groszowej 11 wykonano remont dachu, - w budynku przy ul. Groszowej 49 wykonano prace dekarskie obejmujące zadaszenia kominów oraz naprawę ogniomuru, - w budynku przy ul. Zaułek 15 rozpoczęto remont klatki schodowej, - w budynku przy ul. Lipowej 7 wykonano ocieplenie przegród budowlanych obejmujące izolację fundamentów oraz częściowe ocieplenie dachu. Umowę na realizację zadania podpisano z Miastem Jelenia Góra w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II”. - w budynku przy ul. Karola Miarki 11 wykonano remont klatki schodowej, W latach 2023-2024 w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w budynkach przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52 wykonano remonty klatek schodowych oraz prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną. W latach 2024-2025 w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych:		5 161,00 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 9). Środki wydatkowane w 2025 r.: 34 395,00 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Groszowej 11), 213 932,27 PLN (dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II” oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lipowej 7), 208 740,00 PLN (dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II” oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Podwale 17). Środki wydatkowane w latach 2023-2024: 262 103,15 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy Pl. Ratuszowy 50, 51, 52).

		- dla budynku przy ul. Romualda Traugutta 14 złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc finansową (tzw. premia remontowa) na remont budynku, który ucierpiał w wyniku wrześniowej powodzi. W 2025 r. wykonano remont izolacji fundamentów oraz dokonano naprawy elewacji, - w IV kwartale 2024 r. dla budynku przy ul. Szewskiej 13 złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc finansową (tzw. premia remontowa) na remont budynku, który ucierpiał w wyniku wrześniowej powodzi. W 2025 r. wykonano remont elewacji budynku. W latach 2023-2025 w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Jana Matejki 9 oraz 15 otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2025 r. wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Matejki 15 zakończyła realizację zadania, w wyniku którego wykonano remont elewacji oraz dachu. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Matejki 9 wykonała remont dwóch ścian budynku wraz z docieplenie – prace remontowe nie zostały zakończone w 2025 r. - w 2023 r. dla budynku przy ul. Podwale 17 wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze o wytyczne związane z planowanym remontem budynku, natomiast w 2024 r. wspólnota zawarła umowę z Miastem Jelenia Góra w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie II” finansowanego ze środków		Środki wydatkowe w latach 2023-2025: 768 149,83 PLN (dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jana Matejki 9), 986 105,45 PLN, (dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jana Matejki 15).

		Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2025 r. w ramach programu wykonano ocieplenie przegród budowlanych – ścian budynku. W latach 2023-2025, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Podwale 13*, ul. Zachodniej 13*, Pl. Ratuszowym 10, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 15*, 24, ul. Długiej 6, ul. Jasnej, 3, ul. Szewskiej 7*, ul. Jana Sobieskiego 9, 18*, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 37, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 18, ul. Sudeckiej 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Ludwika Zamenhofa 4, ul. Ludowej 32 nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych. * Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.		
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród czterech zadań ujętych w karcie projektowej, dwa pn. „Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych” oraz „Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1” zostały zakończone. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem rzeczowym wskazanym w GPR. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. liczba nowo wybudowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt. oraz częściowo wskaźnik liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje społeczne – 1 szt. W wyniku realizacji zadania pn. „Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych” w 100 % osiągnięto wskaźnik realizacji przedsięwzięcia dedykowany celom rewitalizacji oraz w 50% w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1”. W ocenie podmiotu realizującego zadania, budowa schroniska dla osób bezdomnych oraz utworzenie kompleksu mieszkań chronionych było odpowiedzią				

na potrzeby mieszkańców miasta, w tym rewitalizowanego podobszaru, w zakresie polityki społecznej oraz zdecydowanie przyczyniło się do zwiększenia dostępności do placówek świadczących usługi opiekuńcze i wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Obiekty dostosowane zostały do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zdecydowanej poprawie uległ stan zagospodarowania terenu wokół budynków, a tym samym estetyka przestrzeni publicznej. Dzięki realizacji zadań, w dużym stopniu zwiększyła się aktywność społeczna, która wpłynęła na wzrost integracji mieszkańców. Ponadto, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych" wykonano remont budynków przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52. Biorąc pod uwagę fakt, iż wskaźnik produktu dla zadania pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych" wynosi 62 szt. (liczba wszystkich budynków, które winny zostać poddane rewitalizacji w ramach zadania), został on osiągnięty wyłącznie w odniesieniu do budynków przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52 – 3 szt. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i zakresem rzeczowym wskazanym w GPR. W ocenie podmiotu realizującego zadanie, rewitalizacja budynków przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52 zdecydowanie przyczyniła się do poprawy stanu technicznego budynku, a także poprawy warunków mieszkaniowych – komfortu zamieszkania. W efekcie realizacji zadania nie nastąpiła poprawa parametrów energetycznych budynku, która mogłaby wpłynąć na redukcję kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nie uległ zmianie stan zagospodarowania terenu wokół budynków (zadanie polegało na remoncie klatek schodowych oraz pracach wodno-kanalizacyjnych), a realizacja zadania raczej nie wpłynęła na wzrost aktywności społecznej mieszkańców. W ocenie podmiotu realizującego zadanie nastąpił wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości życia na rewitalizowanym obszarze. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców				
1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra	Miasto Jelenia Góra	W 2023 r. zadanie realizowano w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra", finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowany został zakres prac obejmujący: 1. Montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi. 2. Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz utworzenie toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie instalacji c.o., wodnej, CWU, kanalizacyjnej, elektrycznej, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w obrębie stropów, ścian i sufitów, - roboty konstrukcyjne, w tym zabezpieczenia p.poż oraz izolacyjne dla konstrukcji stropu drewnianego, wykonanie prac	6 500 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra": 222 791,87 PLN Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej, - środki PFRON, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		zapewniających izolację oraz uzyskanie odporności ogniowej, - prace związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych, - roboty instalacyjne, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wody zimnej i ciepłnej użytkowej, centralnego ogrzewania, - roboty związane z odbudową stropów drewnianych, wykonaniem sufitów systemowych, - montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń sanitarnych, wykonanie prac wykończeniowych, systemowego fakturowego oznaczenia nawierzchni FON, oznaczenie drzwi, zastosowanie pochwytów, systemu powiadomień, montaż urządzeń sanitarnych oraz pomocniczych przystosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 3. W ramach poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i zamontowano tablice informacyjne ogólne oraz tabliczki informacyjne przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2024 r. zadanie nie było realizowane, natomiast w 2025 r. wykonano: - remont schodów wejściowych od strony parkingu, - poręcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie w trakcie realizacji.		Środki wydatkowane w 2025 r.: 56 000,00 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.
2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją	Miasto Jelenia Góra	W 2023 r. zadanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra", finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta". W ramach przedsięwzięcia grantowego zrealizowany został	3 500 000,00 PLN	Kwota środków wydatkowanych w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra": 55 737,90 PLN Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej,

przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii		zakres prac obejmujący: 1. Likwidację progów na parterze budynku oraz przystosowanie ciągów komunikacyjnych, w tym: - niwelowanie barier progowych, wyrównanie podłoży, wykonanie nowych posadzek z wykładzin obiektowych homogenicznych winylowych antypoślizgowych, - oznakowanie pionowe dla osób niedowidzących, przewężeń w ciągach komunikacyjnych. 2. Montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi. 3. W ramach poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i zamontowano tablice informacyjne ogólne oraz tabliczki informacyjne przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 4. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwoleń, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, wykonanie prac związanych z powiększeniem istniejącego miejsca parkingowego do wymiarów wymaganych dla uzyskania miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak: obniżenie krawężników, poszerzenie istniejącego fragmentu chodnika do szerokości 2m, oznakowanie miejsca parkingowego. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta" zrealizowany został zakres prac obejmujący: 1. Przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie instalacyjnym, - roboty w zakresie wykonania przebić przez stropy i ściany, - roboty instalacyjne - ułożenie instalacji centralnego ogrzewania, - roboty w zakresie uzupełnienia posadzek i podłoży wraz z ułożeniem warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych		- środki PFRON, - środki własne Miasta Jelenia Góra. Środki wydatkowane w 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta": 697 300,00 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		i termicznych, odtworzenie okładzin podłogowych w miejscach prowadzonych rozkuć posadzek, uzupełnienia przejść stropowych i przekuć przez ściany, - montaż armatury dla instalacji, armatury regulacyjnej oraz grzejników, - wykonanie prób ciśnieniowych. 2. Prace związane z wymianą wyeksploatowanej podłogi, wraz z wykonaniem prac malarskich i wymianą oświetlenia na energooszczędne. W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - wykonanie modernizacji oświetlenia klatki schodowej wraz z oświetleniem awaryjnym w części budynku A, - przebudowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych (instalacji p.poż, wodociągowej i kanalizacyjnej), - remont pomieszczenia biurowego - kancelarii, korytarzy i klatki schodowej budynku A z zastosowaniem rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, - remont okładzin ściennych oraz wymianę drzwi na spełniające wymogi p.poż w czterech pomieszczeniach sanitariatów, znajdujących się w budynku B. W 2025 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - wykonanie modernizacji oświetlenia klatki schodowej wraz z oświetleniem awaryjnym oraz systemem p.poż. w budynku B, - remont pomieszczeń biurowych w budynku A z zastosowaniem rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (remont ścian, sufitów z pracami wykończeniowymi malarskimi, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemu sygnalizacji pożaru, wymiana wykładzin podłogowych). Zadanie w trakcie realizacji.		Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2024-2025: 853 637,23 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 257 420,00 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.

3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2023 r. w ramach zadania wykonano m.in. przebudowę nawierzchni ulicy Wolności na odcinku 879 m. W 2024 r. zadanie nie było realizowane. W 2025 r. w ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni ulicy Wolności na odcinku od obrębu skrzyżowania z ulicą Lipową (koniec zakresu przebudowy realizowanej w 2023 r.) do sklepu Lidl, o długości 1033 m. Z obszaru przebudowy wyłączono zakres nawierzchni, która została odtworzona w ramach realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)", za wyjątkiem regulacji i wymiany włazów studni sieci kanalizacji deszczowej, wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej oraz azyli na przejściach dla pieszych. Zadanie zostało zakończone dnia 15.12.2025 r.	4 202 500,00 PLN	Łączna kwota wydatkowanych środków: 8 341 560,89 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025: 3 486 103,87 PLN Źródła finansowania: - subwencja, - środki własne Miasta Jelenia Góra.
4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	W 2023 r. w ramach działań własnych wybudowano przyłącze wodociągowe prowadzące z ul. A. Grottgera na teren zielony należący do budynku przy ul. A. Grottgera 1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji budynku wraz z jego zagospodarowaniem, który został unieważniony ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. W 2025 r. podpisano umowę z kierownikiem budowy, a także wybudowano przyłączę wodociągowe prowadzące z terenu	9 834 568,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2025: 65 358,64 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 49 083,56 PLN Źródło finansowania: - środki własne Przedsiębiorstwa

		zielonego do budynku przy ul. Artura Grottgera 1. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 2028 r.		Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	W 2023 r. w związku z realizacją zadania: - przeprowadzano przetarg nieograniczony na roboty polegające na rozbudowie sieci wodociągowej łączącej istniejące sieci umiejscowione w Jeleniej Górze w ulicy Wolności od skrzyżowania z ulicą Tkacką do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego, w celu umożliwienia efektywnego zarządzania sterowaniem zasilania miasta Jelenia Góra w wodę z ujęcia „Grabarów" lub z ujęcia „Sosnówka", - podpisano umowę na realizacji robót wraz z przekazaniem placu budowy, - wybudowano odcinek sieci DN 355 mm o długości około 300 m. W ramach zadania, w 2024 r.: - wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN 355 o długości 687,67 m oraz odcinek sieci wodociągowej DN 160 o długości 6,5 m, - wykonano węzły zasuwowe 4 szt., - zamontowano hydrant p.poż, - odtworzono nawierzchnię jezdni wraz z dodatkowymi robotami drogowymi. W latach 2023-2024 wybudowano łącznie odcinek sieci wodociągowej DN o długości 994,17 m. Zadanie zostało zakończone.	3 500 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2024: 3 943 344,12 PLN Źródło finansowania: - środki własne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 18A, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 5, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W 2023 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - dla budynku przy Al. Wojska Polskiego 8 pozyskano dokumentację uzgodnioną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, decyzję administracyjną oraz audyt energetyczny, - zlecono wykonanie audytu remontowego dla budynku przy Al. Wojska Polskiego 22, - w budynku przy Al. Wojska Polskiego 39 wykonano remont klatki schodowej, w zakresie obejmującym wymianę części tynku wewnętrznego, odnowienie powłok malarskich oraz wykonanie posadzki w części parterowej. W 2024 r. dla budynku przy ul. Wyczółkowskiego 13 wykonany został remont balkonów oraz ganku przy wejściu do budynku. W 2025 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy ul. Wolności 176 wykonano ocieplenie przegród budowlanych (ocieplenie ścian). Umowę na realizację zadania podpisano z Miastem Jelenia Góra, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II”, - w budynku przy ul. Mickiewicza 5 wykonano remont ściany frontowej budynku. W latach 2023-2025 w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - dla budynku przy ul. Wyczółkowskiego 3 wykonano audyt energetyczny oraz projekt budowlany, natomiast dla budynku przy Al. Wojska Polskiego 58 wykonano audyt energetyczny, projekt, a także uzyskano pozwolenie na roboty budowlane oraz decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura	12 285 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2023 r.: 50 000,00 PLN (środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy Al. Wojska Polskiego 39). Środki wydatkowane w 2025 r.: 266 319,93 PLN (dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II” oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wolności 176). 260 917,20 PLN (dotacja z budżetu miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wolności 55).

		w Jeleniej Górze. Dla obu budynków złożono wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W 2024 r. wspólnoty mieszkaniowe otrzymały dofinansowania do zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wyczółkowskiego 3 otrzymała dofinansowanie w wysokości 374 400,82 PLN (wartość całkowita zadania: 534 858,31 PLN), natomiast wspólnota mieszkaniowa przy Al. Wojska Polskiego 58 w kwocie 681 179,46 PLN (wartość całkowita zadania: 973 113,52 PLN), - w roku 2023 dla budynku przy ul. Wolności 55 wykonano dokumentację budowlaną oraz dokonano zgłoszenia prac remontowych w zakresie elewacji budynku i balkonów. W 2025 r. w ramach środków pochodzących z dotacji budżetu miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków wykonano remont elewacji i balkonów na ścianie frontowej budynku, a także remont drzwi i stolarki okiennej. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego 1/1A*, 8, 12, 18A, 22, 27*, 39, 48, 58OF*, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17*, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10*, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20* nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych.		

		* Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.		
7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK	Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój	W ramach zadania zrealizowany został szereg działań mających na celu integrację społeczną, międzykulturową i międzypokoleniową. W 2023 r. zrealizowano następujące działania: **1. Umiem się uczyć po polsku** Projekt adresowany był do młodzieży, która przybyła do Jeleniej Góry w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Celem projektu było wzmocnienie znajomości języka polskiego, z naciskiem na język edukacji szkolnej, rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności uczenia się. Efekty realizacji projektu: - 47 nastolatków z Ukrainy zaangażowało się w projekt, - zrealizowano 240 godzin różnorodnych zajęć, - odbyło się 5 spotkań informacyjno-integracyjnych z rodzicami oraz wycieczka. W działaniach projektowych, oprócz młodzieży z Ukrainy uczestniczyło 24 rodziców/opiekunów, 15 seniorów z Centrum Kompetencji Seniorów, 11 wolontariuszy z liceów oraz 18 gości okazjonalnie uczestniczących w wydarzeniach integracyjnych. Łącznie w działaniach projektowych uczestniczyło 115 osób. **2. Jesienny Klub Nastolatka - zapobieganie przez działanie** Projekt Jesienny Klub Nastolatka - zapobieganie przez działanie był adresowany do nastolatków i ich rodziców/opiekunów. Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	455 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w 2023 r.: 547 973,41 PLN Źródła finansowania: - środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, - środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego, - program dotacyjny – BEZPIECZNI PRZYJACIELE, - Fundacja Świętego Mikołaja, - IKEA, - dotacja z Miasta Jelenia Góra.

		dzieci i młodzieży poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, poszerzanie wiedzy rodziców oraz zapewnienie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu, interakcji w świecie rzeczywistym i budowania relacji. W projekcie uczestniczyło 12 dziewcząt i 10 chłopców w wieku od 12 do 17 lat, zorganizowano 3 spotkania z rodzicami nastolatków, które zgromadziły 25 uczestników, przeprowadzono szkolenie dla rodziców pt. „Uzależnienia cyfrowe dzieci", w którym wzięło udział 14 osób oraz 2 wydarzenia promujące aktywne i świadome życie, w którym uczestniczyło 46 osób. **3. CKS 2.0 - doskonalenie kompetencji cyfrowych i rozwój wolontariatu edukacyjnego seniorów** Celem projektu było doskonalenie kompetencji cyfrowych i rozwój wolontariatu edukacyjnego seniorów. W efekcie realizacji projektu: - 20 osób wzięło udział w szkoleniach, - odbyło się 36 godzin szkoleń pod hasłem „Senior i smartfon", - 27 osób wzięło udział w warsztatach doskonalących kompetencje cyfrowe, - odbyło się 12 godzin warsztatów o tematyce: „Media społecznościowe dla początkujących (Facebook)", „Media Społecznościowe dla średnio zaawansowanych (Facebook)", „Ocalić od zapomnienia – digitalizacja starych zdjęć, korekta i opowiadanie historii za pomocą narzędzi cyfrowych". - przeprowadzono 2 spotkania klubu konwersacyjnego, w których wzięło udział 35 osób, - zorganizowano „Dzień Gier Planszowych", w którym uczestniczyło 33 seniorów.		

		4. Wakacyjny Klub Nastolatka W ramach działania utworzona została przestrzeń do spotkań i aktywnego spędzenia wakacji dla 35 osobowej grupy nastolatków z Ukrainy, Polski i Białorusi. Zorganizowano 8 wycieczek po Dolnym Śląsku i przeprowadzono warsztaty w Fundacji, które trwały łącznie 12 dni. Działania zrealizowane w 2024 r.: **1. Międzynarodowe Centrum Kompetencji Seniorów. Program wieloletni na rzecz osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025.** W projekcie uczestniczyło 85 osób w wieku 60+, w tym 73 osoby z Polski i 12 osób zza wschodniej granicy. Projekt realizował następujące cele: - integracja społeczna i międzynarodowa seniorów z Polski i Ukrainy, aktywizacja edukacyjna seniorów realizowana poprzez różnorodne zajęcia i warsztaty, - zwiększenie poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie, - rozwój umiejętności poznawczych, cyfrowych oraz kompetencji językowych, - poprawa odporności psychicznej i zdolności adaptacyjnych seniorów. Powyższe cele realizowane był poprzez następujące działania: **Moduł 1: „Seniorzy aktywni i sprawni",** w ramach modułu zrealizowano: - treningi poznawcze – 32 godziny, 56 uczestników, - warsztaty terapeutyczne pod hasłem „Budowanie odporności psychicznej seniora" – 18 godzin, 34 uczestników, - warsztaty cyfrowe – doskonalenie kompetencji cyfrowych seniorów – 12 godzin prelekcji i 24 godziny konsultacji, w których		Łączna kwota środków wydatkowanych w 2024 r.: 83 135,09 PLN Źródła finansowania: - środki Skarbu Państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 2024, - Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych.

		udział wzięło 66 osób, - Klub Rummikub – 28 godzin, 26 uczestników, - wydarzenie integracyjne współorganizowane przez seniorów, w których uczestniczyło 80 osób. **Moduł 2: „Seniorzy w Unii Europejskiej"** zrealizowano 16 godzin warsztatów, w których uczestniczyło 47 osób, w tym 4 imigrantów oraz zorganizowano wycieczkę do Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, w której uczestniczyło 36 seniorów, w tym 6 imigrantów. **Moduł 3: „Seniorzy doskonalą komunikację"** – zrealizowano 20 godzin zajęć, w których udział wzięło 19 osób, w tym 7 z Polski i 12 z Ukrainy. **2. Wspólny Świat Seniorów** - to projekt którego celem było zbudowanie międzynarodowej wspólnoty uczących się seniorów zaangażowanych w poznawanie języka polskiego, historii i ciekawych miejsc w okolicy, jak również korzystających z nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia codziennego. W ramach projektu przeprowadzono: - kurs języka polskiego, w którym uczestniczyły 22 osoby, - warsztaty doskonalące kompetencje cyfrowe, - treningi poznawcze, w ramach których przeprowadzono 20 godzin zajęć, - warsztaty integracyjne, w ramach których zorganizowano wycieczki do Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Muzeum Karkonoskiego, KPN, Parku Miniatur, Muzeum PRL, Muzeum Przyrodniczego, Parku Norweskiego, Zamku Książ, - konwersacje w języku polskim – monitoring rówieśniczy, polegające na prowadzeniu konwersacji w mikrogrupach na podstawie przygotowanych m.in. kart opowieści, gier		

		językowych. W celu podsumowania projektu zorganizowano spotkanie w Leśnym Banku Genów, podczas którego seniorzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pn. „Różnorodność gatunków w Arboretrum oraz plener malarski". W wydarzeniu uczestniczyły 63 osoby. W latach 2023-2024 w ramach zadania zrealizowano następujące działania: **1. „Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej!" -** to projekt edukacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" w partnerstwie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Celem projektu było tworzenie relacji poprzez naukę języka polskiego osób z doświadczeniem migracji oraz seniorów i seniorek z Polski. Każdego roku w projekcie uczestniczyło 12 wolontariuszy, seniorów z Centrum Kompetencji Seniorów PL, 12 migrantów z Ukrainy i 1 migrant z Białorusi, a także zrealizowano 364 godziny konwersacji w duetach. **2. Witaj w Klubie Nastolatka** Głównym celem projektu realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji było wsparcie nastoletnich uchodźców wojennych mieszkających w Jeleniej Górze i okolicy, w radzeniu sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i budowaniem wartości relacji w środowisku. W ramach projektu zorganizowano warsztaty rozwojowe, w których uczestniczyło 60 nastolatków z Ukrainy i Polski. W 2025 r. zrealizowano działania: **1. Półkolonie wakacyjne 2025.** W ramach grantu od Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA		Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2024: 47 998,00 PLN Źródła finansowania: - środki pochodzące z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, - środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę. Łączna kwota środków wydatkowanych w 2025 r.: 30 842,60 PLN

		zorganizowano warsztaty rozwojowe, w których wzięło udział 16 nastolatków. **2. Weekend z Japończykami i Japonią** Celem wydarzenia była popularyzacja kultury Japonii poprzez spotkania z Japończykami, prelekcje i warsztaty. W sumie odbyło się 12 wydarzeń, w których wzięło udział 68 osób w różnym wieku, z różnych krajów (Japonia, Polska, Szwajcaria, Ukraina, Białoruś). **3. Kurs na sprawczość - DZIAŁAMY!** Celem projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Kurs na Odporność" realizowanego wspólnie przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Szkoła z Klasą było wzmocnienie sprawczości młodych ludzi, rozwinięcie umiejętności związanych z radzeniem sobie z emocjami oraz budowanie relacji opartych na współpracy i wzajemnym zaufaniu. W projekcie wzięło udział 13 nastolatków w wieku 12–17 lat, w tym 7 osób z Ukrainy i 6 z Polski. **4. Zrozumieć siebie - znaleźć innych - program przeciwdziałania samotności i budowania relacji wśród seniorów.** Celem projektu była profilaktyka uzależnień poprzez realizację programu przeciwdziałania samotności i budowania relacji wśród seniorów. W projekcie uczestniczyło 25 osób w wieku 60+ z Jeleniej Góry, które zadeklarowały potrzebę pomocy w radzeniu sobie z samotnością.		Źródła finansowania: - dotacja z Fundacji POCIECHA), - dotacja z Miasta Jelenia Góra, - środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Kurs na Odporność realizowanego wspólnie przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Szkoła z Klasą, - środki własne Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój.

		5. InDiSo projekt w programie Erasmus+ Integracja Międzykulturowa, Cyfrowa i Społeczna W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu, który powstał w odpowiedzi na współczesne wyzwania: dynamiczną cyfryzację, rosnącą różnorodność kulturową społeczeństw europejskich oraz problem wykluczenia społecznego i cyfrowego osób dorosłych. W ramach projektu: - realizowane są lokalne warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe, społeczne i międzykulturowe uczestników, - odbywają się międzynarodowe mobilności edukacyjne dla dorosłych, - następuje wymiana doświadczeń edukatorów oraz szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie ICT i pracy z grupami zróżnicowanymi kulturowo, - tworzone są materiały edukacyjne i cyfrowe produktów, które będą wspierały dalsze działania integracyjne. Planowany termin zakończenia projektu 31.08.2026 r. W latach 2024-2025 zrealizowano następujące działanie: **Świetlica Środowiskowa w Fundacji PCKK** Celem działania Świetlicy środowiskowej w Fundacji PCKK było wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami rozwojowymi i profilaktycznymi. W 2024 r.: - 32 wychowanków (21 chłopców i 11 dziewcząt) oraz 7 wolontariuszy ze szkół średnich wspierało podopiecznych w nauce. Łącznie odbyło się 100 godzin warsztatów w obszarach tematycznych: psychoedukacja - 31 godzin, pomoc w nauce		Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2024-2025: 164 197,89 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 90 092,89 PLN Źródła finansowania: - dotacja z Miasta Jelenia Góra, - środki własne Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój.

		matematyki - 16 godzin, pomoc w nauce języka polskiego - 15 godzin, pomoc w nauce języka angielskiego – 12 godzin, trening umiejętności społecznych - 26 godzin, - zorganizowano 3 wspólne wycieczki integracyjne, - przeprowadzono spotkanie pod hasłem „Perspektywy Edukacji", podczas którego uczniowie szkół średnich prezentowali swoje szkoły uczestnikom spotkania, - w ramach integracji międzypokoleniowej odbyły się warsztaty malowania na eko-torbach, w których udział wzięło 9 dzieci i 7 seniorów. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Pociecha wychowankowie Świetlicy ubrali wspólnie choinkę i zostali obdarowani przez przedstawicieli Fundacji świątecznymi prezentami. W wydarzeniu uczestniczyło 22 dzieci i 8 rodziców. W latach 2023-2025 zrealizowano projekty pn.: **1. Rozwojowe wakacje w mieście 2023, 2024, 2025** W ramach projektu, w każdym roku zrealizowano po trzy, 5-dniowe edycje warsztatów pn. „Rozwojowe wakacje w mieście", każda w wymiarze 40 godzin. W ramach warsztatów zrealizowany został program merytoryczny oraz program profilaktyczny. W każdym roku, w warsztatach uczestniczyło po 36 dzieci. Ponadto w latach 2024-2025, w ramach projektu „Rozwojowe wakacje w mieście" działał „Wakacyjny Klub Nastolatka". W zajęciach rozwojowych i profilaktycznych wzięło udział łącznie 23 nastolatków. Członkowie Klubu angażowali młodzież w różnorodne działania promujące aktywność fizyczną i dbałość o zdrowie i środowisko. Realizacja ww. inicjatyw przyczyniła się do integracji grup młodzieży oraz rozwoju osobistego uczestników.		Łączna kwota środków wydatkowanych na działania w latach 2023-2025: 133 180,00 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 51 090,00 PLN Źródła finansowania: - dotacja z Miasta Jelenia Góra, - wpłaty od rodziców, - środki własne Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój.

		2. Projekt REMCREAD Wzmocnienie pozycji uchodźczyń i migrantek poprzez metody kreatywne i umiejętności cyfrowe Projekt realizowany był w programie Erasmus+, a jego celem było wzmocnienie pozycji uchodźczyń i migrantek przez zapewnienie im szkoleń, mentoringu i możliwości nawiązywania kontaktów, wspieranie ich działań w kierunku rozwoju i samorealizacji. W 2025 roku uczestniczki projektu wzięły udział w cyklu warsztatów kreatywnych i cyfrowych. Zadanie w trakcie realizacji.		

W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne wykazało, że spośród siedmiu zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej dwa zadania, tj. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności" oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)" zostały zakończone. W odniesieniu do pierwszego zadania, w trakcie jego realizacji nastąpiły opóźnienia o charakterze wykonawczym, które wpłynęły na termin zakończenia realizacji zadania. Niemniej jednak zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w GPR. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. długość przebudowanych dróg gminnych - 2012,00 m, co stanowi 183% zaplanowanej w Programie Rewitalizacji długości drogi do przebudowy. Odnosząc się do drugiego zadania, podczas jego realizacji wystąpiły opóźnienia o charakterze finansowym, wykonawczym, a także związanym z nieprzewidzianymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą (konieczność równoległej do prowadzonych prac wymiany awaryjnej sieci gazowej przez gestora sieci oraz wprowadzenie zmiany technologii odtworzenia nawierzchni drogi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów), które wpłynęły na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Inwestycja została wykonana zgodnie z zakresem ujętym w Programie Rewitalizacji. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm oraz sieci wodociągowej PE DN 160 mm zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji na poziomie 994,17 m, co stanowi 99,19% wartości zaplanowanej w GPR. W ocenie podmiotu realizującego zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności" jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się, realizacja zadania również zdecydowanie wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej i komfortu poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. W ocenie podmiotu realizującego zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)" awaryjność sieci wodociągowej zdecydowanie zmniejszyła się, w efekcie czego jakość wody przeznaczonej do spożycia będzie lepsza. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców na rewitalizowanym obszarze miasta. Całość inwestycji będzie miała zdecydowanie pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.

Podobszar rewitalizacji Cieplice				
Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry				
1. Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach	Miasto Jelenia Góra	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	13 000 000,00PLN	0,00 PLN
2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	6 000 000,00 PLN	0,00 PLN
3. Modernizacja ulicy Juszczaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	Realizację zadania rozpoczęto pod koniec 2023 roku. W 2024 r. zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - przebudowę nawierzchni jezdni ul. Franciszka Juszczaka na odcinku ok. 0,5 km oraz ul. Andrzeja Zamoyskiego na odcinku ok. 0,2 km, - przebudowę chodników wraz z wykonaniem oznakowania z żółtych płytek ostrzegawczych (dostosowanie dla osób niewidomych/niedowidzących), - dostosowanie zjazdów do nowej geometrii ulicy, - przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, - wykonanie przepięć przyłączy sanitarnych, - przebudowę sieci oświetlenia ulicznego wyposażonego w oprawy typu LED. Zadanie zostało zakończone dnia 13.08.2024 r.	1 500 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2024: 6 224 811,87 PLN Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W 2023 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - dla budynku przy ul. Jagiellońskiej 19 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – wniosek nie uzyskał dofinansowania. - budynek przy ul. Franciszka Juszczaka 16 pozyskał dokumentację techniczną, - budynek przy ul. Jagiellońskiej 1 posiadał uzgodnioną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze dokumentację techniczną oraz decyzję dotyczącą prowadzenia robót budowlanych przy zabytku, W 2024 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - podpisano umowę z firmą „SK-ARCHITEKCI" Karolina Rogóż na wykonanie projektów budowlanych dla budynków przy ul. Norberta Barlickiego 1-11, pn. „Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. N. Barlickiego w Jeleniej Górze, - w budynkach przy ul. Norberta Barlickiego 3 oraz 5 wymieniono instalację elektryczną na klatkach schodowych, - w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 7 wymieniono instalację gazową. W 2025 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w budynku przy ul. Cieplickiej 31 wykonano częściowy remont dachu i częściową izolację fundamentów. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 36, 38, 51, 79, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14,	22 566 800,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 235 729,50 PLN (środki własne na wykonanie projektów budowlanych dla wspólnot mieszkaniowych przy ul. Norberta Barlickiego 1-11).

		ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych.		
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród czterech zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej, jedno pn. „Modernizacja ulicy Juszczaka" zostało zrealizowane. W trakcie realizacji zadania wystąpiły opóźnienia o charakterze wykonawczym, które wpłynęły na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Programie Rewitalizacji. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. długość przebudowanych dróg gminnych – 696 m. Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia dedykowany celom rewitalizacji, w odniesieniu do tego zadania zostały osiągnięty w 100%. W ocenie podmiotu realizującego zadanie, jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się. Dostępność komunikacyjna obszaru rewitalizacji i komfort poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych również zdecydowanie poprawiły się, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic				
1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	839 730,00 PLN	0,00 PLN
2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2025 r. zrealizowano zakres rzeczowy zadania obejmujący: - przebudowę istniejących, obustronnych ciągów pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Sprzymierzonych do budynku nr 66, - budowę jednostronnego chodnika od budynku nr 67 do skrzyżowania z ulicą Sobieszowską, - przebudowę istniejących zjazdów, - odcinkowy remont nawierzchni jezdni, - remont elementów sieci kanalizacji deszczowej. Łączna długość budowanych i przebudowanych chodników wyniosła 1446,72 m, w tym: przebudowano 1294,72 m ciągów pieszych i wybudowano 152 m chodnika. Zadanie zostało zakończone dnia 29.09.2025 r.	1 800 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2025 r.: 1 975 763,60 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.

3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 28, 36	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W IV kwartale 2024 r. dla budynków przy ul. Książęcej 5, 7, 9, 10 oraz przy ul. św. Jadwigi Śląskiej 11 złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc finansową (tzw. premia remontowa) na remont budynków, które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. W 2025 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych: - w budynku przy ul. św. Jadwigi Śląskiej 16 wykonano ocieplenie przegród budowlanych obejmujące ocieplenie dachu oraz wszystkich ścian budynku. Umowę na realizację zadania podpisano z Miastem Jelenia Góra w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II”, - w budynku przy ul. Książęcej 6 wykonano ocieplenie przegród budowlanych (ocieplenie ścian budynku). Umowę na realizację zadania podpisano z Miastem Jelenia Góra w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie II”, - w budynku przy ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, ul. Książęcej 7, 9, 10, 11 wykonano izolację fundamentów oraz naprawę uszkodzonych elementów elewacji. W budynku przy ul. Książęcej 5, w 2025 r. rozpoczęto prace remontowe, które będą kontynuowane w 2026 r. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 28*, 36* nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych. * Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie	10 020 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2025 r.: 404 164,32 PLN (dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie – II” oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. św. Jadwigi Śląskiej 16), 249 262,71 PLN (dotacja w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie – II” oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Książęcej 6).

		przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.		
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród trzech zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej jedno pn. „Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego" zostało zakończone. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem rzeczowym wskazanym w GPR. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. długość budowanych i przebudowanych chodników – 1446,72 m, w tym przebudowano 1294,72 m ciągów pieszych oraz wybudowano chodnik o długości 152 m. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 145% wartości zaplanowanej w Programie. W związku z powyższym wskaźnik realizacji przedsięwzięcia dedykowany celom rewitalizacji został osiągnięty w 100%. W ocenie podmiotu realizującego zadanie, jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się. Dostępność komunikacyjna obszaru rewitalizacji i komfort poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych również zdecydowanie poprawiły się, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej				
1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	1 500 000,00 PLN	0,00 PLN
2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze - Cieplicach	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	11 000 000,00 PLN	0,00 PLN
3. Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - przebudowę drogi gminnej o długości 174 m (Plac Kombatantów) wraz z przebudową przyległego parkingu	1 147 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 2 537 114,85 PLN

		(przebudowa miejsc postojowych oraz drogi manewrowej o długości około 116 m), - remont istniejących chodników i zjazdów, - przebudowę oświetlenia ulicznego i budowę oświetlenia ciągów pieszych, - wymianę studzienek kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustu ulicznego, - elementy małej architektury i nasadzenia zieleni miejskiej. Zadanie zostało zakończone dnia 03.12.2024 r.		Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, - środki własne Miasta Jelenia Góra.
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W IV kwartale 2024 r. dla budynków przy ul. Wolności 246, 253 złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc finansową (tzw. premia remontowa) na remont budynków, które ucierpiały podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Remont budynków zostanie przeprowadzony w 2026 r. W 2025 r. w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w budynku przy Pl. Zdrojowym 1 wykonano remont dachu wraz z opapowaniem, naprawą poszycia, wymianą włazu dachowego wraz z obróbkami, rynnami i spustami. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 248, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1 nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych.	8 128 000,00 PLN	Środki wydatkowe w 2025 r.: 40 000,00 PLN (środki własne, Pl. Zdrojowy 1).
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród czterech zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej jedno pn. „Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów" zostało zakończone. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem rzeczowym wskazanym w GPR. Osiągnięto wskaźnik produktu, tj. długość przebudowanych dróg gminnych – 290 m. Jednocześnie wskaźnik				

realizacji przedsięwzięcia dedykowany celom rewitalizacji, w odniesieniu do tego zadania został osiągnięty w 100%. W ocenie podmiotu realizującego zadanie, jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się. Dostępność komunikacyjna obszaru rewitalizacji i komfort poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych również zdecydowanie poprawiły się, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Podobszar rewitalizacji Sobieszów				
Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów				
1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowalnych, wykonano interwencyjne prace zabezpieczające i porządkowe. Zlecono ekspertyzy mające ocenić stopień degradacji obiektów oraz określić kierunek dalszych działań. Podpisano aneks rozszerzający zakres zadania o roboty w zakresie zadania – Budynku 1 wynikające z ekspertyzy. Ponadto podpisano umowę na nadzór autorski w zakresie Budynku 1 oraz na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wymaganej dla kontynuacji prac. W 2024 r. w Budynku 1 (Senior +) zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący m.in.: - wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych z płytek, - prace wykończeniowe i malarskie, - montaż witryn i drzwi aluminiowych wewnętrznych, - wykonanie sufitów podwieszanych, - zamontowano i uruchomiono ogrzewanie budynku (piec elektryczny) oraz główną rozdzielnię elektryczną. W budynku „A” (Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne) wykonano: - instalację hydrantową oraz do central wentylacyjnych, - przystąpiono do prac murarskich, - wykonano szyb windowy, - wymurowano ściany piętra,	15 000 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych środków w latach 2023 -2025: 18 234 774,49 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 8 947 832,55 PLN Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Polski Ład, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		- wykonano montaż stolarki okiennej z PCV. W 2025 r. w Budynku 1 (Senior +): - zakończono prace budowlane wewnątrz budynku, - zakończono prace przy elewacji budynku, - zamontowano złącza kablowe zewnętrzne. W budynku „A" (Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne): - wykonano izolacje podpłytkowe i zamontowano płytki, - zrealizowano wewnętrzne prace malarskie, - wykonano wylewki pod wykładziny obiektowe, - pomalowano armaturę i wymienniki ciepła w kotłowni, - wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, - zamontowano konstrukcję stalową zewnętrznej klatki schodowej, - docieplono ściany zewnętrzne budynku, - zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku, - rozpoczęto montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia realizacji zadania II kwartał 2026 r.		
2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowalnych, wykonano interwencyjne prace zabezpieczające i porządkowe. W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - montaż zbrojenia podszybia windy i fundamentu klatki schodowej, - izolację przeciwwilgociową, - wybudowano I piętro budynku.	8 500 000,00 PLN	Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2023-2025: 10 678 115,22 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 4 939 901,06 PLN Źródła finansowania: - środki PFRON, - Rządowy Fundusz Polski Ład, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		W 2025 r. w ramach zadania: - zakończono wewnętrzne prace malarskie, - wykonano wylewki pod montaż wykładzin obiektowych, - wykonano instalacje eklektyczne i sanitarne, - wykonano izolacje podtynkowe oraz zamontowano płytki, - wybudowano ścianki działowe, - pomalowano armaturę i wymienniki ciepła w kotłowni, - zamontowano ościeżnice i stolarkę drzwiową, - wykonano elewację budynku, - zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku, - wykonano i uruchomiono ogrzewanie podłogowe, - rozpoczęto prace związane z budową tarasu zewnętrznego, - rozpoczęto montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia realizacji zadania II kwartał 2026 r.		
3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: - przebudowę nawierzchni ulicy Cieplickiej na odcinku 626 m, - przebudowę dwóch zatok autobusowych, - częściowy remont nawierzchni chodników, - przebudowę/remont studni i studzienki kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane dnia 30.12.2024 r.	11 977 500,00 PLN	Środki wydatkowane w 2024 r.: 1 860 340,04 PLN Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122,	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W 2024 r. wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieplickiej 142 otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie	6 182 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2025 r.: 782 969,29 PLN (dofinansowanie przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5, ul. Karkonoskiej 5, ul. Kolejowej 1		FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2025 r. wspólnota mieszkaniowa zakończyła realizację zadania w zakresie obejmującym remont elewacji wraz z docieplenieniem. W latach 2023-2025 w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122*, 130*, 176, 178, 201*, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5*, ul. Karkonoskiej 5*, ul. Kolejowej 1 nie rozpoczęto realizacji zadań rewitalizacyjnych. * Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.		Dolnego Śląska 2021-2027 oraz środki własne wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cieplickiej 142).
W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród czterech zadań ujętych w niniejszej karcie projektowej jedno zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia" zostało zakończone. W trakcie realizacji zadania wystąpiły opóźnienia o charakterze wykonawczym, które wpłynęły na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Wskaźnik produktu, tj. długość przebudowanych dróg gminnych – 626 m został osiągnięty na poziomie 94%. W ocenie podmiotu realizującego zadanie, jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowanie poprawiła się. Dostępność komunikacyjna obszaru rewitalizacji i komfort poruszania się po zrewitalizowanych ciągach pieszo-jezdnych również zdecydowanie poprawiły się, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców). Dzięki realizacji zadania estetyka przestrzeni publicznej uległa poprawie. Pozostałe zadania rewitalizacyjne ujęte w karcie projektowej nie zostały zrealizowane i zakończone, w związku z czym nie zostały ocenione w badaniu ankietowym.				
Podobszar rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów				
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej	Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w mieście Jelenia	W 2023 r. przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku	3 000 000,00 PLN	Środki wydatkowane w 2023 r. w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze": 1 314 119,54 PLN

	Góra oraz podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w przedsięwzięciu, prowadzące działalność na lokalnym rynku pracy	pracy. Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - konkursy horyzontalne. W projekcie udział wzięły 4 szkoły kształcące zawodowo z miasta: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych. W efekcie realizacji projektu, w 2023 r.: - zorganizowano 39 praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w których uczestniczyło 64 uczniów, - zorganizowano 84 godziny doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 42 uczniów, - zorganizowano 1 kurs dedykowany dla kadry pedagogicznej placówek kształcących zawodowo, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli. W latach 2024-2025 przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji, Rozwój kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2026 r. W projekcie uczestniczy 7 szkół kształcących zawodowo w mieście: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”, Zespół Szkół Technicznych		Źródła finansowania: - RPO WD 2014-2020, - środki własne Miasta Jelenia Góra. Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2024-2025, w ramach projektu „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”: 6 707 522,85 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 1 953 005,57 PLN Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej, - środki krajowe, - dotacja z budżetu państwa, - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		„Mechanik", Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. W efekcie realizacji projektu, w latach 2024-2025: - zorganizowano praktyki zawodowe i staże uczniowskie u 223 pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w których uczestniczyło 424 uczniów, - przeprowadzono 28 godziny kursów zawodowych i doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 603 uczniów, - zorganizowano 8 kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, w których uczestniczyło 241 uczniów i którzy uzyskali świadectwa, certyfikaty i dyplomy potwierdzające nabycie kwalifikacji, - liczba zorganizowanych kursów/szkoleń doskonalących/studiów kierowanych do kadry pedagogicznej wyniosła 12, a uczestniczyło w nich 102 nauczycieli kształcących zawodowo oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poza realizowanymi projektami w latach 2023-2025 Miasto przekazało środki finansowe na studia podyplomowe dla 42 nauczycieli jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, a także na szkolenia branżowe i rad pedagogicznych. W 2025 r. Miasto przeznaczyło środki finansowe na studia uzupełniające magisterskie dla 2 nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Środki umożliwiły podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kształcącej. Poza realizowanymi projektami, w 2023 r. szkoły kształcące zawodowo w Jeleniej Górze (Zespół Szkół Technicznych „Mechanik" oraz Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka") kontynuowały współpracę dualną z 3 przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku pracy, a 7 szkół kształcących zawodowo w mieście		Kwota środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej (poza projektami): - 55 601,80 PLN (studia podyplomowe), - 10 400,00 PLN (studia uzupełniające magisterskie), - 565 573,93 PLN (szkolenia branżowe i rad pedagogicznych). Źródło finansowania: - środki własne Miasta Jelenia Góra.

		współpracowało z ponad 70 przedsiębiorcami działającymi na jeleniogórskim rynku pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, zajęć specjalistycznych, wycieczek zawodoznawczych, spotkań, warsztatów i prelekcji organizowanych dla uczniów. W latach 2024-2025 współpraca dualna nie była realizowana.		
Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.	1. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 2. Osiedlowy Dom Kultury, 3. Jeleniogórskie Centrum Kultury, 4. Uczelnie Wyższe w mieście Jelenia Góra: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, Politechnika Wrocławska Filia w Jeleniej Górze, 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział	W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl ogólnodostępnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych obejmujący: 1. 40. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Placu Ratuszowym - podczas 3 dni Festiwalu zaprezentowano 14 ulicznych spektakli grup teatralnych pochodzących z Polski, Włoch, Czech i Ukrainy. Imprezą towarzyszącą była wystawa plakatu oraz najciekawszych zdjęć ukazująca 40-letnią historię festiwalu. Codziennie wieczorem prezentowano projekcję filmów archiwalnych z roku 1983 i 1987 oraz ostatnich 5 lat. W wydarzeniu uczestniczyło 9760 osób. 2. 51. i 52. Jarmark Staroci i Osobliwości jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy aby zaprezentować swoje zbiory na Placu Ratuszowym i wzdłuż urokliwych uliczek Starego Miasta. Podczas Jarmarku można było kupić zabytkowy samochód, stare meble, broń, przedmioty ze szkła i porcelany, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. Zwiedzający i potencjalni kupujący przez dwa dni oglądali, targowali się, słuchali ciekawych historii, kupowali, uzupełniali bądź wymieniali swoje zbiory. W 2023 r. Jarmark odbył się dwukrotnie. Podczas wydarzenia swoje zbiory prezentowało około 165 wystawców (podczas każdego z dwóch	900 000,00 PLN	Łączna kwota wydatkowanych środków: 936 433,00 PLN, w tym: Ad. 1. 275 888,00 PLN Źródła finansowania: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pogram Teatr i Taniec, - środki własne instytucji kultury, - dotacja Miasta Jelenia Góra, - inne źródła. Ad. 2. 0,00 PLN Ad. 3. 204 979,00 PLN Źródła finansowania: - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, - dotacja Miasta Jelenia Góra.

	Rejonowy w Jeleniej Górze	terminów Jarmarku), a uczestniczyło w nim łącznie około 1800 osób po około 900 osób na każdym Jarmarku. 3. Festiwal Art & Glass to spotkanie utalentowanych artystów, rzemieślników i pasjonatów z Polski i Czech. Podczas wydarzenia odbyły się: widowiskowe pokazy obróbki szkła nad palnikiem, wypału ceramiki, kamionki i porcelany, warsztaty tworzenia biżuterii oraz mozaiki szklanej, pokazy wydmuchiwania szkła przy przenośnych piecach szklarskich oraz show odlewnicze z brązu i aluminium. Dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci zorganizowano interaktywne warsztaty. Podczas Festiwalu odbył się pokaz tańca argentyńskiego tancerzy z grupy „Tango Karkonosze", koncert inaugurujący 65. Wrzesień Jeleniogórski!, występ grupy tanecznej flamenco z JCK oraz Karoliny Wojtko w programie KARO'LINA & FRIENDS, muzyka grupy SHUM. Na zakończenie Festiwalu odbył się koncert zespołu VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ. W Festiwalu uczestniczyło około 10000 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji, tradycje kultury". 4. Jarmark Świąteczny na Placu Ratuszowym (Jarmark Bożonarodzeniowy) zgromadził wielu mieszkańców miasta, którzy w świątecznym nastoju mieli okazję do obejrzenia i zakupu świątecznych dekoracji, upominków gwiazdkowych oraz regionalnych produktów. Podczas Jarmarku odbyły się warsztaty artystyczne i kulinarne, m.in. wykonania piernikowych kamieniczek, lampionów, ozdób świątecznych, malowania bombek. Zorganizowano Mikołajkowe Wesołe Miasteczko, animacje „Świątek - piątek z elfami", koncerty kolęd m.in. Chóru „COLORUS", a na zakończenie odbyła się Miejska Wigilia. W Jarmarku Świątecznym uczestniczyło około 7000 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji,		Ad. 4. 130 055,00 PLN Źródła finansowania: -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, - dotacja Miasta Jelenia Góra, - środki własne instytucji kultury. Ad. 5. 288 831,00 PLN Źródła finansowania: - Program współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, - dotacja Miasta Jelenia Góra, - środki własne instytucji kultury. Ad. 6. 36 680,00 PLN Źródła finansowania: - dotacja z Urzędu Miasta Jelenia Góra, - środki własne.

		tradycje kultury”. 5. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia' 2023 na Błoniach Jeleniogórskich. Juwenalia to tradycyjne święto studentów, podczas którego odbywają się koncerty, wystawy i pokazy. W edycji odbywającej się w 2023 r. zorganizowano: - w dniu 19 maja koncerty zespołów: PEGE, 75 ZONE, LUCA, QIUBA XAIROSIU, ZAPPA, CZARNY, KANASTA, KANASTA & CZARNY, a gwiazdami wieczoru byli BIAŁAS i LIBER, - w dniu 20 maja wystąpili: DJ MILO, STEPIEN, KUDŁATY, INCONTRO, BUTY SAPERA, INSANE&MASS, gwiazdą wieczoru był GROMEE, a na zakończenie zorganizowano dyskotekę DMC Maciej Wowk, - w dniu 21 maja odbył się finał LIGI ROCKA, podczas którego wystąpili: 30 Zeta, Comepass, Punched Orange, Deceaded, Asses of Fire z Niemiec, odbyło się rozdanie nagród laureatów Jeleniogórskiej Ligi Rocka, a także koncert Krzysztofa Zalewskiego. Łączna liczba uczestników Juwenaliów wyniosła między 12 000-15 000 osób. 6. Senioralia' 2023 rozpoczęły się korowodem prowadzącym od Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do Pl. Ratuszowego, na którym nastąpiło przekazanie kluczy do miasta przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry seniorom. Podczas senioraliów odbył się koncert, Bal Seniora, a na zakończenie Koncert Laureatów. W wydarzeniu uczestniczyło około 2700 osób. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2023 r.		
Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów	Straż Miejska w Jeleniej Górze	W latach 2023-2025 w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono spotkania profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjne	50 000,00 PLN	Spotkania organizowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia,

w mieście Jelenia Góra.		w następujących obszarach tematycznych: 1. „Bezpieczna Droga do Szkoły, do Przedszkola” – w ramach spotkań omówiono działania mające na celu zabezpieczenie drogi przy placówkach oświatowych oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Zorganizowano 60 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło łącznie około 2000 dzieci. 2. „Karta Rowerowa” („Bezpieczny rowerzysta” organizacja egzaminu na kartę rowerową) – przeprowadzono zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej oraz zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. Zwieńczeniem zajęć było przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Łącznie zorganizowano 35 spotkań, w których udział wzięło 445 uczniów. 3. „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie” – przeprowadzono łącznie 109 spotkań, zajęć edukacyjnych oraz festynów promujących bezpieczny i właściwy sposób spędzania czasu wolnego podczas wakacji oraz 50 spotkań odnoszących się do bezpieczeństwa podczas ferii. Spotkania przeprowadzono również w 5 placówkach opiekuńczych. W wydarzeniach uczestniczyło około 9000 osób, w tym dzieci ze szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczych. 4. „Płytka wyobraźnia to kalectwo” – w ramach akcji kontrolowano kąpieliska oraz spotykano się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą nad wodą, w celu propagowania właściwego zachowania się na kąpielisku i sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Przeprowadzono 6 akcji kontroli kąpielisk, w których uczestniczyło około 240 osób.		w większości zrealizowano dzięki zaangażowaniu pracowników Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Wkład rzeczowy w postaci gadżetów, upominków i nagród został pozyskany od sponsorów. W odniesieniu do niektórych działań udało się pozyskać środki od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej MKRPA). Łączna kwota wydatkowanych środków w latach 2023-2025: 87 000,00 PLN, w tym środki wydatkowane w 2025 r.: 39 000,00 PLN Źródło finansowania: - środki MKRPA.

		5. „Bądź Sobą Nie Pij Alkoholu i Nie Zażywaj Narkotyków” – w ramach działania zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów piątych klas szkół podstawowych o wyżej wskazanej tematyce. W latach 2023-2024 przeprowadzono konkurs w 8 szkołach podstawowych i uczestniczyło w nim około 400 dzieci. W 2025 r. konkurs przeprowadzono w 11 szkołach podstawowych i uczestniczyło w nim około 250 dzieci. 6. „O smogu Naszym Wrogu” – w ramach działania, każdego roku w 5 jeleniogórskich szkołach podstawowych przeprowadzono zajęcia edukacyjne propagujące ekologiczne postawy w życiu i wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza i dbałości o nie. Łącznie w spotkaniach udział wzięło blisko 800 uczniów. 7. „Wizerunek zaufania do służb mundurowych” - podczas spotkań i festynów przeprowadzono działania edukacyjne mające na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z rolą, uprawnieniami, zadaniami i obowiązkami pracowników Straży Miejskiej realizowanymi na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa. Działania miały na celu poprawę wizerunku służb mundurowych. Przeprowadzano 103 spotkania, w których uczestniczyło około 10 000 osób. Poza wyżej wymienionymi działaniami, w 2025 r. w 7 jeleniogórskich szkołach podstawowych przeprowadzono spotkania pod hasłem „Stop przemocy i agresji”, które dostosowane były potrzeb różnych grup wiekowych. Podczas spotkań rozmawiano z uczniami na tematy przemocy rówieśniczej, agresji i hejtu między uczniami.		

		W latach 2023-2025 zorganizowano następujące spotkania dla osób dorosłych, w tym seniorów: 1. „Czy chciałbyś być na moim miejscu”, w ramach spotkań rozmawiano i uświadamiano uczestnikom z jakimi trudnościami w życiu codziennym (chociażby w zakresie blokowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób posiadających inwalidzkie karty parkingowe) borykają się osoby starsze, w tym z niepełnosprawnościami. Zorganizowano 8 spotkań o ww. tematyce, w których uczestniczyło około 180 osób. 2. „Bezpieczna Jelenia Góra – Bezpieczny Senior” – przeprowadzono 11 spotkań w 3 placówkach opiekuńczych, których celem było uświadomienie osobom starszym, w tym seniorom sytuacji, podczas których mogą stać się ofiarami różnego rodzaju wyłudzeń, w tym finansowych. W spotkaniach wzięło udział około 320 osób. Ponadto, zorganizowano konkurs „Ładnie mieszkać”, który adresowany był do właścicieli posesji i miał na celu promowanie dbałości o estetykę i otoczenie. W 2023 i 2025 r. przeprowadzono spotkania pod hasłem „Walka z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami”, podczas których uświadamiano uczestnikom z jakimi trudnościami w codziennym życiu borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Zwrócono uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie zorganizowano 8 spotkań w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których uczestniczyło około 300 osób. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.		

W związku z koniecznością dokonania oceny przebiegu i efektów realizacji zadań ujętych w GPR, do wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych skierowano ankietę ewaluacyjną. Spośród trzech przedsięwzięć realizowanych w różnych obszarach miasta (podobszar rewitalizacji Śródmieście, Cieplice, Sobieszów) zrealizowano i zakończono jedno pn. „Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra". W ramach przedsięwzięcia odbyło się 6 wydarzeń kulturalno-artystycznych, w tym: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jarmark Staroci i Osobliwości, Festiwal Art & Glass, Jarmark Bożonarodzeniowy, Juwenalia oraz Senioralia. Zgodnie z oceną dokonaną przez podmioty realizujące zadania, wszystkie wydarzenia odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Biorąc pod uwagę różnorodność wydarzeń były one dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, a ich organizacja zdecydowanie wpłynęła na rozszerzenie oferty czasu wolnego dla mieszkańców. Wydarzenia w dużym stopniu, a w przypadku Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w bardzo dużym stopniu wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności i „ożywienie" rewitalizowanego obszaru miasta. Wydarzenia takie jak „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych", „Jarmark Staroci i Osobliwości", „Juwenalia" i „Senioralia" „zdecydowanie wpłynęły na wzrost integracji społecznej mieszkańców i nawiązanie relacji międzyludzkich, a także przyczyniły się do wzrostu poczucia tożsamości lokalnej, natomiast „Jarmark Bożonarodzeniowy" raczej wpłynął na wzrost integracji społecznej mieszkańców i nawiązanie relacji międzyludzkich oraz poczucia tożsamości lokalnej. W odniesieniu do „Festiwalu Art & Glass" realizator zadania wskazał, iż trudno jest w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy wydarzenie wpłynęło na wzrost integracji społecznej mieszkańców i nawiązanie relacji międzyludzkich, ale raczej wpłynęło na wzrost poczucia tożsamości lokalnej. „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych" był wydarzeniem, które w największym miało wpływ na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, natomiast pozostałe wydarzenia, w ocenie realizatorów przyczyniły się do tego, jednakże w nieco mniejszym stopniu. Wszystkie wydarzenia odbyły się w przestrzeni publicznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (płaski teren, brak barier architektonicznych). W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia osiągnięto wskaźnik produktu, tj. liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno-artystycznych – 6 szt., a tym samym osiągnięto wskaźnik realizacji GPR dedykowany celom rewitalizacji.
W ramach przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej" zrealizowany i zakończony został projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze" natomiast projekt pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" zostanie zakończony dnia 30 czerwca 2026 r. Pomimo tego, że jeden z projektów jest jeszcze w realizacji osiągnięte zostały wskaźniki produktu, tj. liczba placówek kształcących zawodowo uczestniczących w przedsięwzięciu – 7, liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu – 347 osób, w tym 241 uczniów i 106 nauczycieli, liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w przedsięwzięciu – 262, liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia – 106 nauczycieli. W każdym ze wskaźników osiągnięte wartości znacznie przekroczyły przyjęte wartości bazowe wskazane w Programie Rewitalizacji. Osiągnięto wskaźniki realizacji przedsięwzięcia dedykowane celom rewitalizacji. Odnosząc się wyłącznie do zakończonego już projektu, tj. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze" został on zrealizowany zgodnie z przejętym harmonogramem. W ocenie podmiotu realizującego, projekt w dużym stopniu był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niedostosowaniem oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia szans absolwentów na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Zrealizowany projekt w zdecydowanym stopniu wpłynął na wzrost postaw przedsiębiorczych uczniów uczestniczących w różnych formach kształcenia/dokształcania/rozwijania kluczowych kompetencji. Warto nadmienić, że w związku z projektem kadra pedagogiczna podniosła swoje kwalifikacje i zdobyła nowe kompetencje, co miało wpływ na zdecydowaną poprawę jakości kształcenia w jeleniogórskich szkołach kształcących zawodowo. Zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna uzyskali formalne potwierdzenie nabytych kwalifikacji, w formie świadectw, certyfikatów i dyplomów. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej projektu pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców, jak również przedsięwzięcia pn. „Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra" zostaną przedstawione po ich zakończeniu, w kolejnym raporcie ewaluacyjnym z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym zaprezentowane zostały wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, osiągnięte w latach 2023-2025 r.

Tabela 2. Wskaźniki realizacji GPR dedykowane celom rewitalizacji.

Wskaźnik	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2024 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2025 r.	Stopień osiągnięcia wskaźnika (%)
Długość wybudowanych dróg gminnych	33 m	0 m	33 m	-	100%
Długość przebudowanych dróg gminnych	2930 m	879 m	1782 m	1033 m	126%
Długość budowanych i przebudowanych chodników	1000 m	0 m	0 m *	1446,72 m	145%
Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji	226 szt.	0 szt.	3 szt.	0 szt.	1,33%
Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	1 szt.	1 szt.	-	-	100%
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	1 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0%
Liczba nowopowstałych obiektów świadczących usługi społeczne	1 szt.	0 szt.	0 szt.	1 szt.	100%
Liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury uzdrowiskowej	1 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0%
Liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje społeczne	2 szt.	0 szt.	1 szt.	0 szt.	50%
Liczba przebudowanych budynków pełniących nowe funkcje społeczne	3 szt.	0 szt.	0	0 szt.	0%
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych rewitalizacji	3 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0%
Długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm oraz sieci wodociągowej PE DN 160 mm zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji	1002,3 m	300 m	694,17 m*	-	99,19%
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	3 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0%

Liczba miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	10 szt.	0 szt.*	0 szt. *	0 szt.	0%
Liczba szkół i placówek kształcących zawodowo uczestniczących w przedsięwzięciu	5 szt.	4 szt.	7 szt.	7 szt.	140%
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu	50 os.	4 osoby*	247 osób	96 osób	694%
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w przedsięwzięciu	5 szt.	39 podmiotów	126 podmiotów	97 podmiotów	5240%
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia	10 os.	4 nauczycieli	6 nauczycieli	96 nauczycieli	1060%
Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno - artystycznych	6 szt.	6 szt.	-	-	100%
Liczba przedszkoli, szkół i placówek pobytu seniorów, w których przeprowadzone zostały spotkania profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych	20 szt.	23 przedszkola/szkoły/placówki pobytu seniorów	45 przedszkoli/szkół/placówek pobytu seniorów	109 przedszkoli/szkół/placówek pobytu seniorów	885%
Liczba zorganizowanych spotkań profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych w ciągu roku	30 szt.	75 szt.	75 spotkań	105 spotkań	850%

* Zmienione wartości wskaźników w 2023 i 2024 r. wynikają z weryfikacji/rozliczenia/zakończenia realizacji zadań/projektów.

III. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne odgrywają istotną rolę w procesie rewitalizacji, ponieważ wpisują się w cele i kierunki działań określone w GPR, a co za tym idzie ich realizacja będzie się przyczyniała do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Stopień realizacji przedsięwzięć uzupełniających w latach 2023-2025 przedstawiony został poniżej.

1. „Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego – Plac Kościuszki w Jeleniej Górze"

W 2024 r. w ramach realizacji zadania wykonano roboty przygotowawcze, dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni z podbudową, krawężników oraz ogrodzenia placu zabaw i elementów małej architektury. Wykarczowano drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, zlikwidowano schody terenowe, wybudowano instalację sanitarną na potrzeby publicznej toalety oraz fontanny. W roku 2025 wykonano zagospodarowanie terenu - ścieżki, elementy małej architektury, plac zabaw i siłownie zewnętrzną, odbudowo i uruchomiono zabytkową fontannę oraz wybudowano toaletę publiczną.

Całkowita wartość zadania: 2 748 643,08 PLN, z tego:
- 1 719 516,40 PLN (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)
- 1 029 126,68 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

Środki wydatkowane w 2024 r.: 245 412,00 PLN, w tym:
- 168 288,40 PLN (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)
- 77 123,60 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

Środki wydatkowane w 2025 r.: 2 503 231,08 PLN, w tym:
- 952 003,08 PLN (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)
- 1 551 228,00 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

Zadanie zakończone w 2025 r.

2. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia"

Dnia 29.11.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W grudniu 2025 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, podczas którego autor dokumentacji projektowej wskazał i omówił lokalizację odwiertu. Przystąpiono do opracowania planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.

Całkowita wartość zadania: 23 763 866,00PLN, z tego:
- 18 794 978,00 PLN (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- 4 968 888,00 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

Środki wydatkowane w latach 2024-2025: 0,00 PLN

Planowana data zakończenia zadania: IV kwartał 2027 r.

3. Poprawa infrastruktury basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59

W 2025 r. we współpracy z konserwatorem zabytków opracowano wstępną koncepcję przebudowy basenu, a także rozpoczęto prace nad postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji technicznej.

Całkowita wartość zadania: 73.800.000,00 PLN, z tego:
- 60 000 000,00 PLN (pożyczka z Krajowego Planu Odbudowy)
- 13 800 000,00 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

Środki wydatkowane w 2025 r.: 61 776,75 PLN

4. Centrum Aktywności Obywatelskiej

W 2025 r. przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2025-2027 zadania publicznego pn. „Prowadzenie Jeleniogórskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej". Centrum ma wspierać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby fizyczne w działalności na rzecz pożytku publicznego, oferując m.in. doradztwo, przestrzeń do pracy i spotkań oraz rozwój kompetencji zawodowych. Działania te mają również promować współpracę społeczną i partycypację obywatelską w mieście. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłonieni zostali realizatorzy zadania, działający wspólnie: Fundacja „Jagniątków", Fundacja Rozwoju Holistycznego i Zrównoważonego Windmill Tree oraz Fundacja Mavka. Dnia 17 marca 2025 r. podpisana została umowa z Fundacją „Jagniątków", która na mocy umowy partnerskiej zawartej między organizacjami została wskazana do reprezentowania partnerstwa przed organami administracji publicznej.

Całkowita wartość zadania w 2025 r.: 158 796,00 zł, w tym:
- 106 900,00 PLN (dotacja Miasta Jelenia Góra)
- 44 296,00 PLN (inne środki finansowe własne)
- 7 600,00 PLN (wkład osobowy)

5. Jeleniogórskie Centrum Wspierania Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

W 2025 r. wybrany został lokal przy Al. Wojska Polskiego 18 na cele prowadzenia Jeleniogórskiego Centrum Wspierania Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, a także opracowano treść ogłoszenia konkursowego na realizację w latach 2026-2029 zadania publicznego pn. „Prowadzenie Jeleniogórskiego Centrum Wspierania Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym".

6. „Przebudowa ulicy Panieńskiej w Jeleniej Górze"

W 2024 r. zrealizowano przebudowę nawierzchni jezdni trzech odcinków ulicy Panieńskiej o łącznej długości 245 m oraz powierzchni 1106 m^2. Wyremontowano chodniki o powierzchni 85 m^2.

Całkowita wartość zadania: 521 989,84 PLN
Data zakończenia realizacji zadania: 02.02.2024 r.
Planowana jest przebudowa kolejnego odcinka ulicy Panieńskiej o długości ok. 100 m oraz przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie całej ulicy. Planowany koszt przedsięwzięcia: 700 000,00 PLN.

7. **„Modernizacja zieleńca przy ul. Karkonoskiej”**

W II kwartale 2024 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonało doraźne prace polegające na podniesieniu rzędnych nawierzchni alejki (transport, rozścielenie oraz zagęszczenie drobnego materiału kamiennego). Prace zostały wykonane w ramach Umowy Wykonawczej zawartej pomiędzy Spółką i Miastem, z dnia 30 kwietnia 2015 r. o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra.

8. **„Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze”**

W 2024 r. w ramach zadania „Aktywny Plac Zabaw Dwójki – doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze” wykonano zakres rzeczowy zadania polegający na modernizacji infrastruktury placu zabaw.

Całkowita wartość zadania: 149 199,00 PLN (środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

9. **„Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze”**

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania: dokonano wymiany nawierzchni placu zabaw oraz elementów jego wyposażenia.

Całkowita wartość zadania: 407 237, 10 PLN (środki Funduszu Pomocy Ukrainie).

10. **„Poprawa infrastruktury i efektowności energetycznej Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”**

W 2024 r. w ramach zadania pn. „Remont daszków przyległych do budynku głównego szkoły” wykonano zakres rzeczowy zadania obejmujący remont pokrycia dachowego wraz z upierzeniami na budynku głównym, przybudówce, sali gimnastycznej, łączniku do sali gimnastycznej oraz nad pomieszczeniem gospodarczym.

Całkowita wartość zadania: 80 000,00 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

11. **„Tu mieszkam i odpoczywam” – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ul. Drzymały, Świętojańskiej, Złotniczej**

W ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2025 r. złożone zostały dwa wnioski „Zielony i praktyczny zakątek” oraz „Wspólny problem rozwiążemy razem”. Oba zakresy rzeczowe zadań wpisują się w zgłoszone do GPR przedsięwzięcie. W pierwszym wniosku zawarty został zakres rzeczowy obejmujący nasadzenia zieleni, natomiast w drugim m.in. zrobienie nowej drogi wokół trzech ulic (wewnątrz) i ustawienie nowych boksów śmietnikowych. Wnioski nie przeszły oceny merytorycznej.


IV. Wskaźniki rezultatu osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w latach 2023-2025

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra dla każdego przedsięwzięcia ujętego w karcie projektowej (przedsięwzięcia podstawowe), określono rezultaty jego osiągnięcia wraz ze sposobami oceny. Zgodnie z przyjętą metodologią wskaźniki rezultatu weryfikowane będą rok po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia. Na przestrzeni lat 2023-2025 zakończone zostały następujące przedsięwzięcia, dla których zaprezentowano wskaźniki

rezultatu: „Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra", „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)" oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne – drogowe: „Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4", „Modernizacja ulicy Juszczaka", „Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów" i „Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia".

Końcem 2023 r. zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra" (tabela 34 w GPR). W związku z powyższym, w terminie od dnia 18 grudnia 2024 r. do dnia 19 stycznia 2025 r. przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców rewitalizowanych obszarów dotyczącej poziomu atrakcyjności oferty kulturalno-artystycznej miasta. Ankieta dostępna była w wersji elektronicznej (interaktywnej), a także papierowej, aby każdy z mieszkańców mógł wybrać bardziej dogodną formę dla siebie. W ramach badania ankietowego, w którym udział wzięło 115 respondentów (104 respondentów skorzystało z formularza w wersji elektronicznej, 11 respondentów z formularza w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra) oceniane były wydarzenia realizowane w ramach ww. przedsięwzięcia, tj.: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jarmark Staroci i Osobliwości, Festiwal Art&Glass, Juwenalia, Senioralia oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

Biorąc pod uwagę atrakcyjność poddanych badaniu wydarzeń kulturalno-artystycznych za najbardziej atrakcyjne wydarzenie (ocena 5 - wydarzenie bardzo atrakcyjne) respondenci uznali Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (63 głosy respondentów), następnie Jarmark Bożonarodzeniowy (55 głosów respondentów), Festiwal Art&Glass (47 głosów respondentów), Jarmark Staroci i osobliwości (46 głosów respondentów) i na piątym miejscu Juwenalia (36 głosów respondentów). Za relatywnie mniej atrakcyjne wydarzenie respondenci uznali „Senioralia". Pomimo tego, że wydarzenie przez 24 respondentów zostało ocenione jako bardzo atrakcyjne, aż 35 respondentów oceniło je jako średnio atrakcyjne, 15 respondentów - mało atrakcyjne, a 18 respondentów nieatrakcyjne.

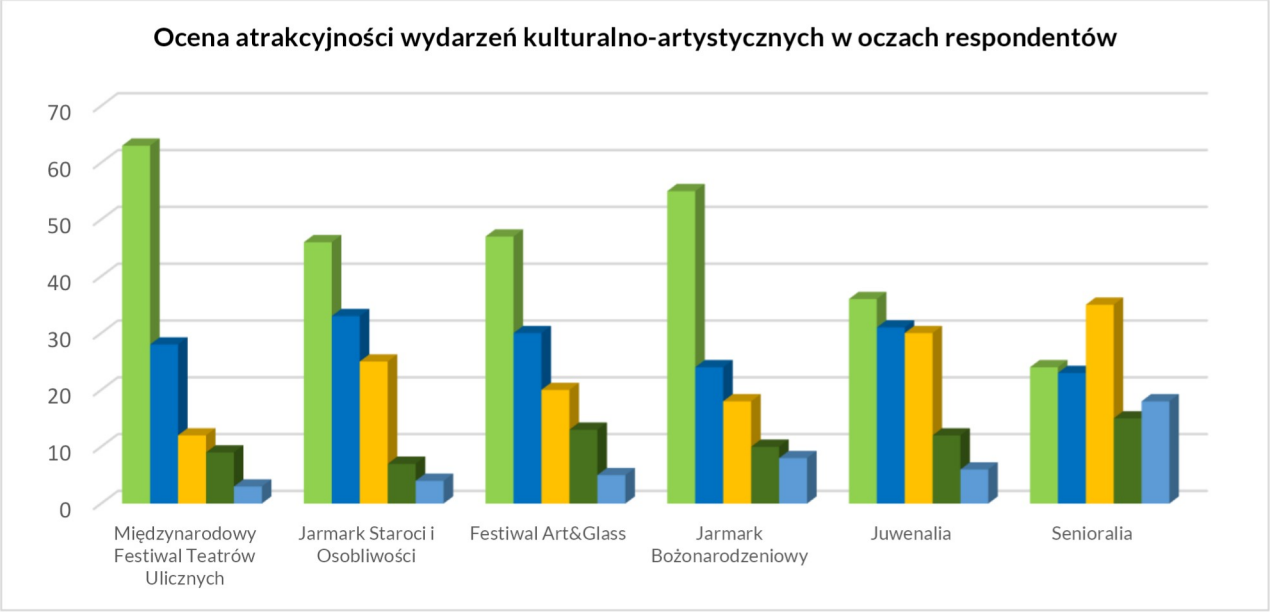

Zdaniem ponad połowy respondentów (73%) oceniane wydarzenia kulturalno-artystyczne

odpowiadają na potrzeby różnych grup wiekowych, a co więcej w opinii 86,1% ankietowanych udział w ww. wydarzeniach sprzyja podtrzymywaniu i nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz kształtowaniu lokalnej tożsamości. Według 77,4% respondentów wspólny udział społeczności miasta w organizowanych wydarzeniach wpływa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Należy podkreślić, że aż 85,2% ankietowanych wzięłoby udział w kolejnej edycji ww. wydarzeń kulturalno-artystycznych, 3,5% respondentów nie miało zdania w tej kwestii, natomiast 11,3% odpowiedziało negatywnie.

W badaniu ankietowym uczestniczyło 74,8% kobiet i 25,2% mężczyzn. Najliczniej reprezentowanymi grupami respondentów były osoby w wieku 35-44 lat (40,9%) oraz 45-55 lat (30,4%), zdecydowanie mniej licznymi osoby w wieku 25-34 lata (15,7%) oraz 55-64 lata (5,2%), natomiast najmniej licznymi w wieku 18-24 lat (4,3%), a także 65 i więcej lat (3,5%). Biorąc pod uwagę podobszar rewitalizacji, zdecydowana większość badanych 68,7% reprezentowała Śródmieście, następnie Cieplice (27%) i Sobieszów (4,3%).

Podsumowując przeprowadzone badanie ankietowe i opinie respondentów należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia pn. „Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra" przyczyniła się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu, tj. wzrostu atrakcyjności miasta Jelenia Góra dla różnych grup wiekowych, a także realizacji celów rewitalizacji, tj. celu strategicznego 1. „Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców" i celów operacyjnych: 1.2. „Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców", 1.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".


Kolejne zakończone przedsięwzięcie to „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego)". W celu weryfikacji wskaźnika rezultatu, w dniach 17 i 19 września 2025 r. pracownik Wydziału Rozwoju Miasta (koordynator procesu rewitalizacji) przeprowadził wywiad z mieszkańcami miasta dotyczący zrealizowanego przedsięwzięcia. Wywiad miał charakter bezpośredni (twarzą w twarz) i wzięło w nim udział 78 mieszkańców podobszaru rewitalizacji śródmieście, w szczególności ul. Wolności (na odcinku od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego) oraz ulic przyległych, m.in. Szewskiej, Traugutta, Powstańców Wielkopolskich, Lipowej, Panieńskiej, Bolesława Prusa, Morcinka, Wyczółkowskiego, Żeromskiego, Orkana. Każdemu respondentowi zadano po trzy pytania, które związane były z realizowaną inwestycją. Wywiad miał charakter anonimowy.

Pierwsze zadane respondentom pytanie dotyczyło tego, czy inwestycje mające na celu rozbudowę/budowę sieci wodociągowych w mieście są ważne i czy warto je podejmować? Respondenci w 100% potwierdzili, że inwestycje mające na celu rozbudowę/budowę sieci wodociągowych w mieście są ważne i należy je podejmować. Wśród powodów, dla których należy realizować tego typu inwestycje znacząca większość pytanych (80,8%) wskazała rozwój miasta, a także fakt, iż infrastruktura jest przestarzała przez co jest awaryjna, w efekcie czego jakość wody pitnej ulega pogorszeniu, co może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. Wśród innych odpowiedzi, respondenci wskazali, że inwestycje w sieci wodociągowe przyczyniają się do ograniczenia strat wody podczas awarii (9,0%), że nowoczesne rozwiązania pozwalają na monitorowanie i zarządzanie dostawami wody (3,8%), a także zwrócili uwagę, że częste awarie mogą niekorzystnie wpływać na środowisko (3,8%). Zestawienie udzielonych przez respondentów odpowiedzi zawiera tabela 3.


Tabela 3. Czy inwestycje mające na celu rozbudowę/budowę sieci wodociągowych w mieście są ważne i czy warto je podejmować?

Lp.	Odpowiedzi respondentów	Liczba oddanych głosów [%]
1.	Tak, ponieważ przyczyniają się do rozwoju miasta.	33,3 %
2.	Tak, ponieważ infrastruktura jest przestarzała, często psuje się.	29,5 %
3.	Tak, ponieważ przestarzała infrastruktura pogarsza jakość wody pitnej i może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.	18 %
4.	Tak, ponieważ istnieją nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury wodociągowej, tzw. inteligentne systemy zarządzania siecią, które można wdrożyć podczas realizacji inwestycji.	2,6 %
5.	Tak, ponieważ inwestycje w infrastrukturę wodociągową przyczyniają się do ograniczenia strat wody, które mogą wystąpić podczas awarii.	9,0 %
6.	Tak ponieważ nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury wodociągowej pozwalają na monitorowanie i zarządzanie dostawami wody.	3,8 %
7.	Tak, ponieważ częste awarie sieci wodociągowej mogą źle wpływać na środowisko.	3,8 %

W kolejnym pytaniu wywiadu respondentów zapytano, o to czy inwestycja zrealizowana na odcinku ulic od Al. Wojska Polskiego do ul. Tkackiej wyeliminuje problem dystrybucji wody o odpowiedniej jakości. Zdaniem ponad połowy respondentów (65,4%) inwestycja z pewnością zminimalizuje częstotliwość awarii (19,2% respondentów), a także wyeliminuje problem dystrybucji wody o odpowiedniej jakości (46,2% respondentów). Udzielone przez respondentów odpowiedzi potwierdzają, jak ważne dla mieszkańców są inwestycje, o charakterze stricte technicznym, których choć na „pierwszy rzut oka" nie widać, to mają ogromne znaczenie w ich codziennym funkcjonowaniu. Należy zauważyć, że 29,5% respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi, natomiast 5,1% respondentów wskazało, że przedmiotowa inwestycja nie wyeliminuje problemu dystrybucji wody.

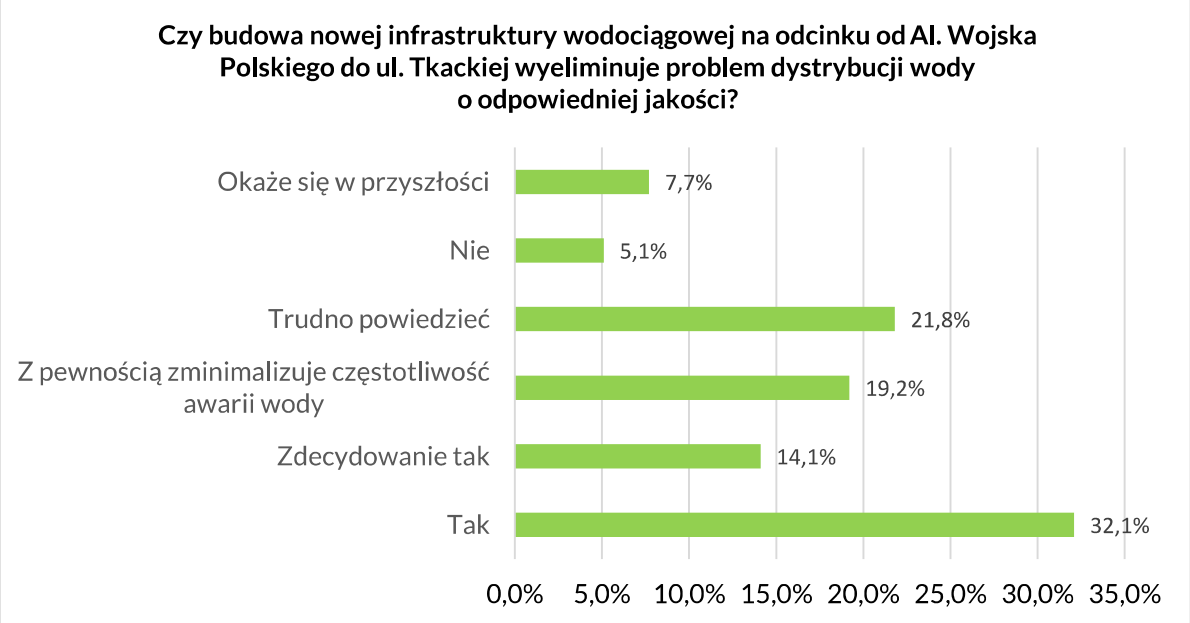

Ostatnie pytanie zadane respondentom dotyczyło wpływu zrealizowanej inwestycji na ich życie. Spośród wszystkich respondentów 92,3% mieszkańców wskazało, że zrealizowana inwestycja wpłynie na życie mieszkańców miasta i ten wpływ będzie pozytywny, ponieważ „awarie będą zdarzały się rzadziej", „zminimalizowane zostaną przerwy w dostawach wody", „poprawią się parametry wody pitnej i jej jakość", „mieszkańcy będą zdrowsi". Niecałe 10% respondentów (7,7%) odpowiedziało, że „nie ma zdania".

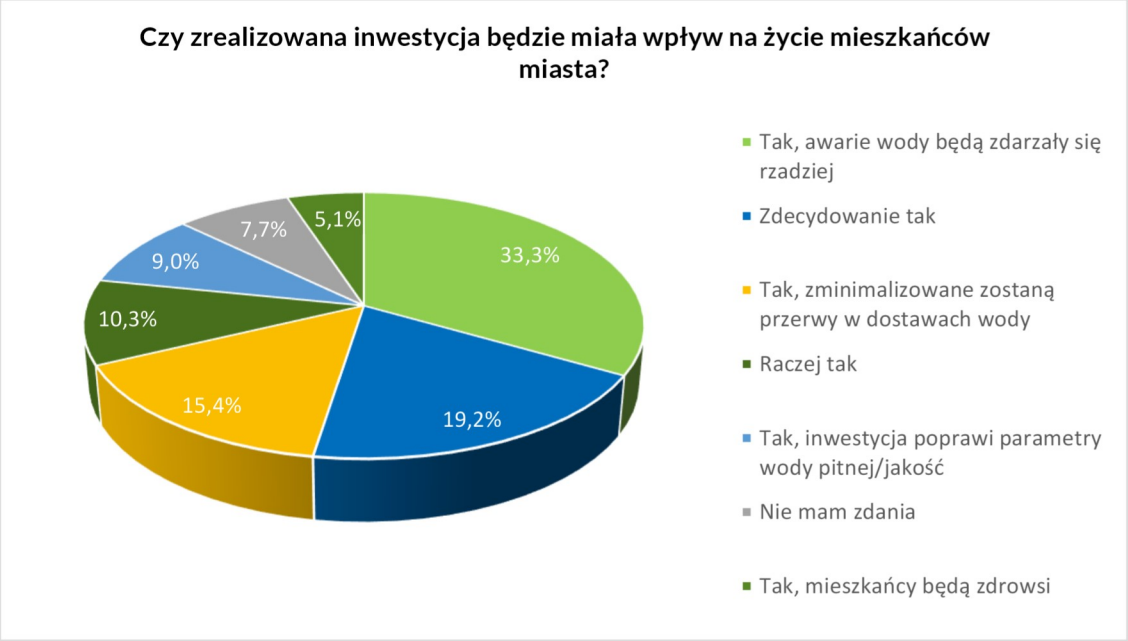

Przeprowadzony wywiad potwierdził jak duże znaczenie dla mieszkańców miasta mają inwestycje infrastrukturalne, w tym przypadku inwestycja w sieć wodociągową. W udzielanych odpowiedziach mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, że nowa inwestycja przyczyni się do zmniejszenia problemów dystrybucji wody - poprawy paramentów wody pitnej i tym samym jej jakości, co korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców. Pomimo tego, że 5% mieszkańców było zdania, że przeprowadzona inwestycja nie wyeliminuje problemów dystrybucji wody, blisko 100% respondentów potwierdziło jej pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu tj. Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wyeliminowanie problemu dystrybucji wody o odpowiedniej jakości oraz poprawę warunków mieszkaniowych, a także do realizacji celu strategicznego 2. „Spójność przestrzenno – funkcjonalna" i celu strategicznego 3. „Lepsza jakość środowiska naturalnego".

Wśród zadań z zakresu infrastruktury drogowej, które zostały zrealizowane znalazły się: „Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4", „Modernizacja ulicy Juszczaka", „Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów" i „Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia". Zgodnie z informacją otrzymaną z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – Wydziału Ruchu Drogowego od momentu zakończenia

realizacji zadań w 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia drogowe i zdarzenia drogowe z udziałem pieszych na przebudowanych ciągach komunikacyjnych. Realizacja ww. zadań przyczyniła się do osiągnięcia celu strategicznego 2. „Spójność przestrzenno-funkcjonalna", a tym samym celu operacyjnego 2.3. „Poprawa dostępności układu komunikacyjnego".

V. Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (dalej: Komitet Rewitalizacji) został powołany Zarządzeniem nr 0050.2281.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 kwietnia 2024 r. (Zarządzenie zmieniające nr 0050.236.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra). Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostali wybrani w drodze otwartego naboru Kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji, naboru uzupełniającego, a także zostali wyznaczeni w drodze polecenia reprezentacji. Zgodnie z ww. zarządzeniem zmieniającym Komitet Rewitalizacji liczy łącznie 12 Członków, w tym:

- 6 Członków, którzy zgłosili się w drodze otwartego naboru będących reprezentantami podobszaru rewitalizacji Cieplice, Śródmieście oraz spoza obszaru rewitalizacji, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, a także Fundacji „Nasza Fundacja",
- 6 Członków wyznaczonych w drodze polecenia reprezentacji będących przedstawicielami Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został powołany w celu wsparcia działań Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w obszarze zadań związanych z rewitalizacją miasta. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Jelenia Góra w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji w mieście, jak również pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Zakres działania Komitetu Rewitalizacji obejmuje:

1. wsparcie doradcze Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zakresie dbałości o prawidłową realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra,
2. wyrażanie opinii i stanowisk oraz rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji,
3. ocenę postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji,
4. prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, a organami gminy,
5. możliwość inicjowania partnerstw między Miastem a partnerami projektowymi, w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR,
6. opiniowanie raportów z ewaluacji GPR, przekazywanie uwag i zaleceń Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

Od momentu powołania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone zostały cztery posiedzenia. Poniżej, pokrótce scharakteryzowany zostanie zakres tematów omawianych podczas każdego z nich. W 2024 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (16 maja 2024 r. oraz 28 listopada 2024 r.). Podczas pierwszego posiedzenia wybrany został Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, którym została Pani Barbara Graczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, a także zastępca, którym została Pani Dorota Amerek mieszkanka podobszaru rewitalizacji Cieplice. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostali zapoznani z najistotniejszymi informacjami odnoszącymi się do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz raportem dotyczącym stopnia realizacji zadań ujętych w GPR za 2023 r. Podczas drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zaprezentowana została prezentacja multimedialna zawierająca zagadnienia takie jak:

- Budżet obywatelski jako narzędzie wspierające realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
- Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- Główne źródła dofinansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
- Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.
- Propozycja zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Uczestnicy posiedzenia zgłosili również dwa nurtujące ich problemy związane z utrzymaniem czystości, porządku i bezpieczeństwa przy ul. Adama Mickiewicza 7 (okolice Aresztu Śledczego) oraz na Wieży Zamkowej przy ul. Jasnej.

W 2025 r. również zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (20 maja 2025 r. i 20 listopada 2025 r.). Podczas posiedzenia, które odbyło się w maju, zaprezentowano raport za 2024 r. z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, zwracając uwagę na stopień realizacji zadań podstawowych (przedstawionych w wiązkach projektowych dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji) i zadań uzupełniających, zwrócono uwagę m.in. na zakres rzeczowy realizowanych zadań, kwoty wydatkowanych środków, a także planowane terminy zakończenia ich realizacji. Podkreślono, które zadania zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji przez wspólnoty mieszkaniowe otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, typ projektów: 2.2.A. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, które ubiegają się o środki w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie", które zwróciły się o pomoc finansową w związku ze stratami poniesionymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. oraz rozpoczęły realizację swoich zadań z własnych środków. Ponadto wskazano zadania, których realizacja zakończyła się w 2024 r. lub w 2023 r. Uczestnikom zaprezentowano działania podstawowe i uzupełniające, a w ramach nich poddziałania zgłoszone do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się w listopadzie (za zgodą Członków Komitetu Rewitalizacji) odbyło się w innej niż dotychczas formie, ponieważ zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej przedstawiciel BGK). Wzięli w nim udział Członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz zaproszeni

przez Miasto Jelenia Góra zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Podczas spotkania przedstawiciel BGK zaprezentował aktualnie dostępne na rynku formy wsparcia finansowego, dedykowane m.in. dla podmiotów rynku mieszkaniowego, tj. Pożyczki unijne dla JST i innych podmiotów na Dolnym Śląsku 2021 – 2027, w tym:

1. „Pożyczkę na poprawę efektywności energetycznej budynków i oświetlenia ulicznego”,
2. „Pożyczkę na OZE dla instytucji”.

Uczestnicy spotkania zostali również zaznajomieni z wymogami formalnymi dotyczącymi złożenia wniosku, w tym koniecznością przeprowadzenia audytu energetycznego oraz analizy wykonalności. Przedstawiciel BGK wskazał instytucje, do których można składać wnioski, strony internetowe, na których znaleźć można szczegółowe informacje na temat oferowanych instrumentów finansowych wraz z materiałami pomocniczymi i wzorami dokumentów.

Przygotowała:
Daria Kozłowska
Wydział Rozwoju Miasta
